

RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRAFICO		Contrato:	2025.7421.3575
		Nr. Ordem de Serviço:	260030909
		Elaboração: Ygor Augusto Fernandes	Data de Elaboração: 17/04/2026
Agência:	7138/00	Tipo de relatório:	Data de Atendimento:
Nome:	EMPRESA TANGARA DA SERRA		
UF:	MT	Preventivo	17/04/2026



Dados da Dependência

Endereço: R. OLIVIO DE LIMA, 96-W - - - - CEP: 0
Responsável da Dependência: F2190439 - SISTEMA
Responsável Técnico: Alexandre Marcos
Responsável Técnico/Empresa: Ygor Augusto Fernandes Ferrugem – CREA: 1017279403/D-GO



Foto 1

- **Descrição do serviço:** Informamos a realização de visita técnica à agência para levantamento preventivo. A atividade contou com o acompanhamento integral do gerente **Rafael Hilgenberg** - Matrícula **F.8.367.305-9**. Durante a vistoria, foram identificadas necessidades de intervenção nos seguintes itens.

SUMÁRIO

- Área externa:	4
1 - Pintura acrílica:	5
2 - Pintura de calçada:	17
3 - Pintura automotiva:	21
- Telhado:	23
1 - Manta aluminizada:	24
- Área interna:	38
1 - SAA (sala de autoatendimento):	38
1.1 - Pintura acrílica:	39
1.2 - Forro de fibra mineral:	44
1.3 - Adesivo:	47
1.4 - Grafema:	50
1.5 - Capacho:	51
2 - Atendimento:	53
2.1 - Pintura acrílica:	54
2.2 - Forro de fibra mineral:	62
2.3 - Lâmpadas:	68
3 - Suporte:	71
3.1 - Pintura acrílica:	72
3.2 - Forro de fibra mineral:	78
4 - Corredor de acesso:	81
4.1 - Pintura acrílica:	82
4.2 - Piso porcelanato:	89
5 - Banheiro masculino:	93
5.1 - Pintura acrílica:	94
5.2 - Ducha higiênica:	98
6 - Banheiro feminino:	99
6.1 - Pintura acrílica:	100
6.2 - Torneira automática:	104
7 - Banheiro PNE:	106
7.1 - Pintura acrílica:	107
7.2 - Torneira automática com alavanca:	109
7.3 - Dispenser de sabão:	111
8 - DML:	112
9 - Almoxarifado:	113
10 - Copa:	114
10.1 - Piso porcelanato:	115
11 - Suporte 2:	119
11.1 - Pintura acrílica:	120
11.2 - Forro de fibra mineral:	127
12 - Sala private:	131
12.1 - Lâmpadas:	132
13 - Casa de máquinas:	135
14 - Corredor de abastecimento:	136
15 - CAIEX:	137

16 - Tesouraria: _____ 138

17 - Setor público: _____ 139

- *Memorial de cálculo e itens:* _____ *Erro! Indicador não definido.*

- Área externa:

- Vista ampla:



Foto 2

1 - Pintura acrílica:

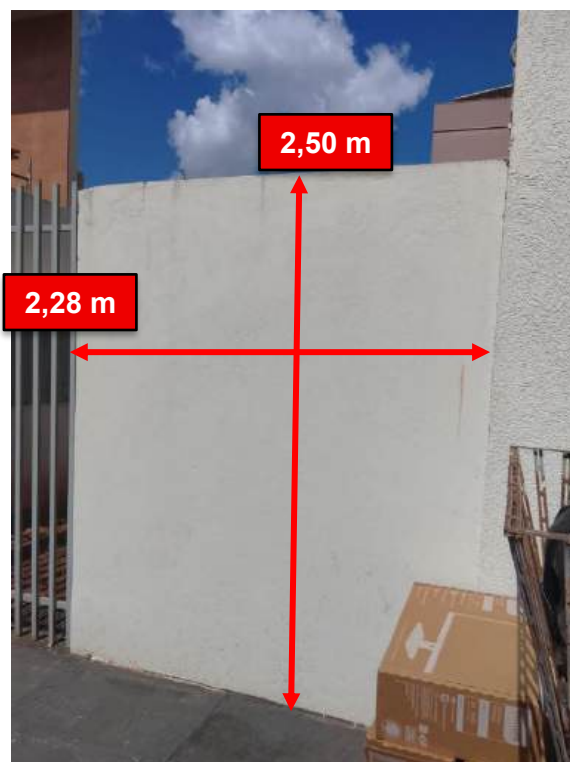
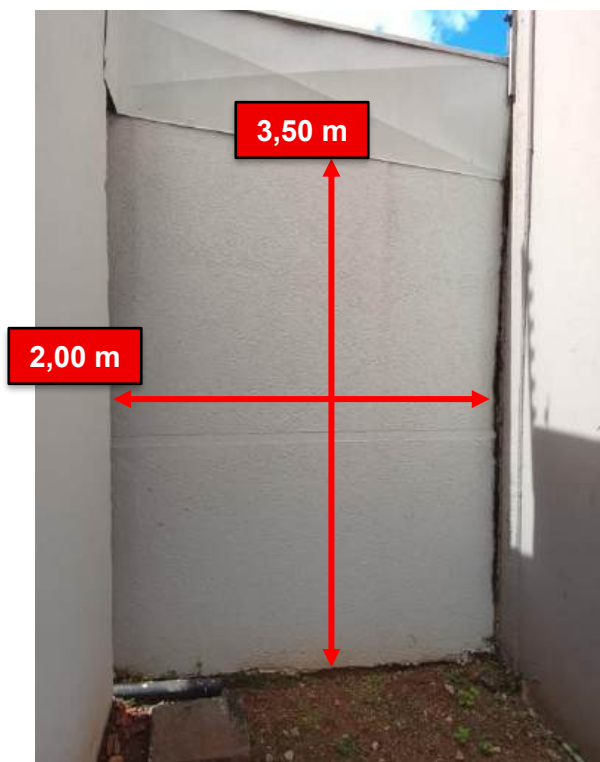




Foto 7



Foto 8



Foto 9

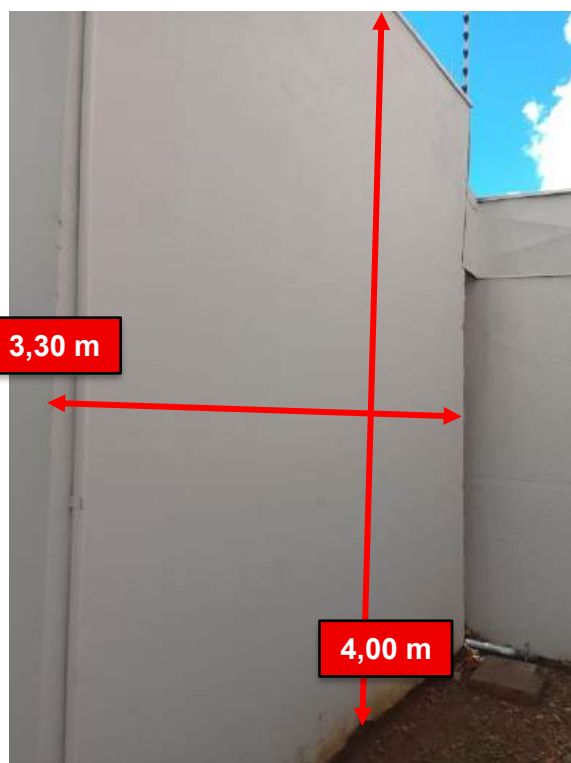


Foto 10



Foto 11

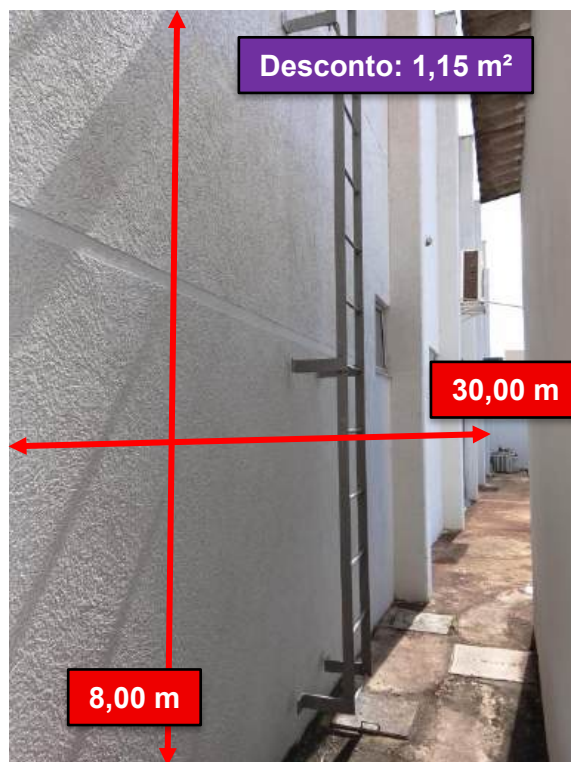


Foto 12

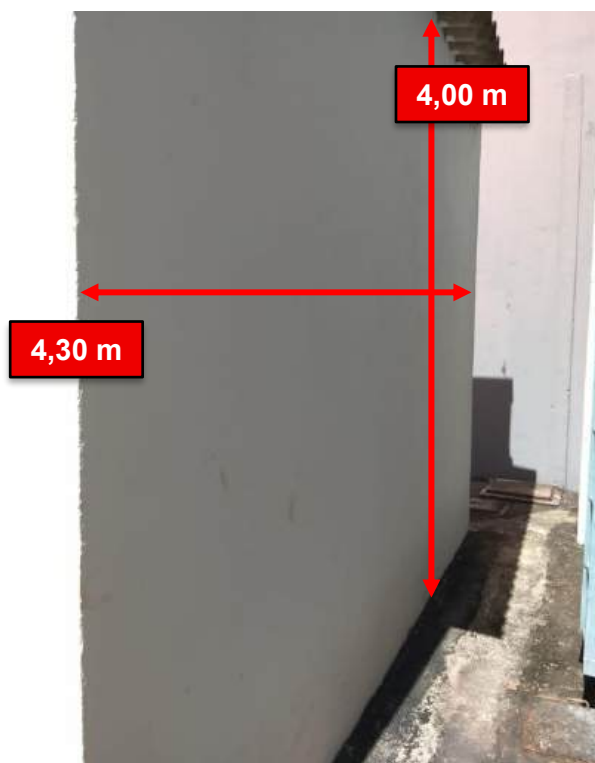


Foto 13



Foto 14

- Detalhes:



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31

- Prezados, as paredes e muros da área externa estão sujos e com a pintura desgastada, o que prejudica a aparência do local. É necessária a repintura com tinta acrílica para melhorar o acabamento e conservar as superfícies. Para realizar o serviço, será necessário utilizar **6,00 m de andaime tipo torre metálica**. (itens 17.4 e 2.21 do contrato)

17.4 Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 3	10,00	8,00	1,55	80,00
Foto 4	15,00	3,80	0,00	57,00
Foto 5	2,00	3,50	0,00	7,00
Foto 6	2,28	2,50	0,00	5,70
Foto 7	21,00	8,00	2,15	168,00
Foto 8	24,00	2,80	0,78	67,20
Foto 9	24,00	8,00	0,00	192,00
Foto 10	3,30	4,00	0,00	13,20
Foto 11	3,40	4,00	3,78	13,60
Foto 12	30,00	8,00	1,15	240,00
Foto 13	4,30	4,00	0,00	17,20
Foto 14	4,57	8,00	0,00	36,56
Subtotal			9,41	897,46
Total				888,05

2.21 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	
REFERÊNCIA	TOTAL (m/mês)
Foto 3 a 31	6,00
Total	6,00

Itens			
17.4	Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior	888,05	m²
2.21	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	6,00	m/mês

2 - Pintura de calçada:

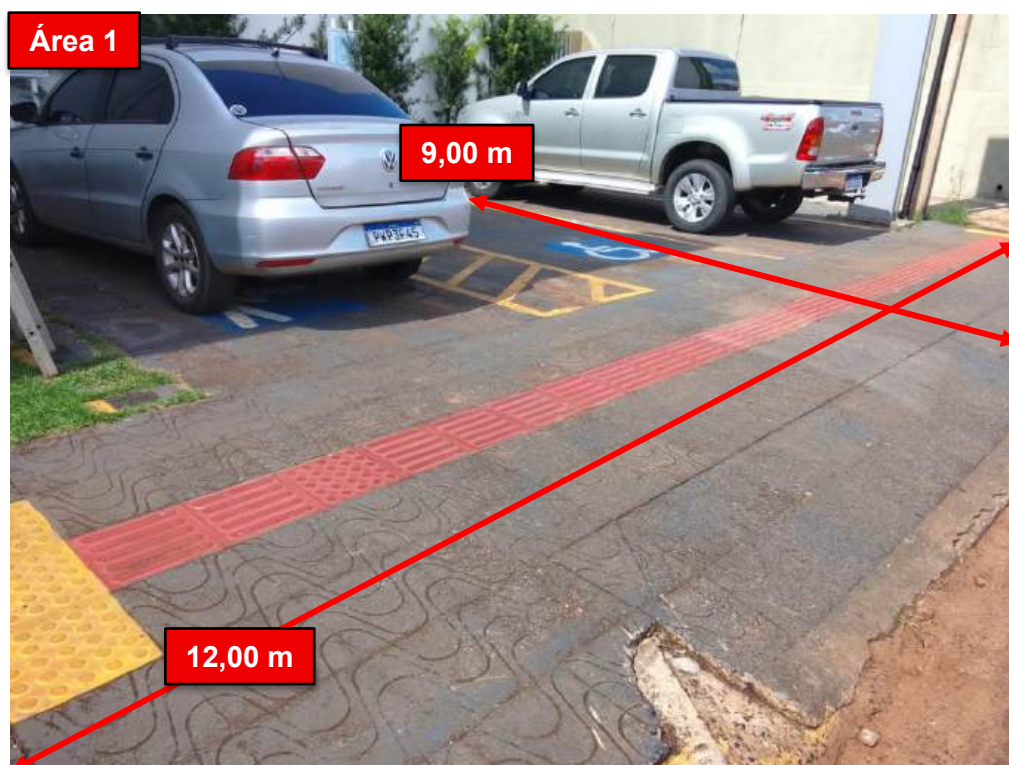


Foto 32



Foto 33



Foto 34

- Detalhes:



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40

- Croqui

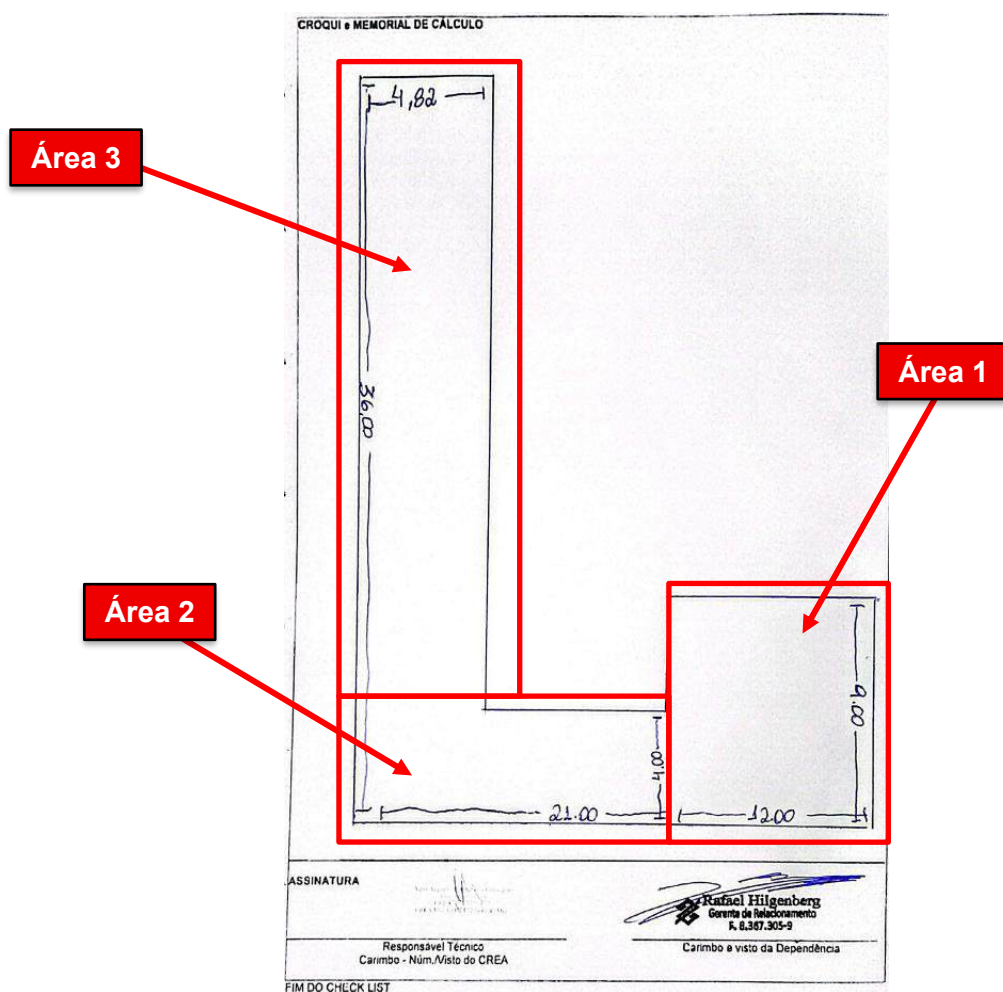


Foto 41

- Prezados, a calçada ao redor da agência está com manchas, desgaste e sujeira acumulada, prejudicando a aparência do local. É necessária a pintura acrílica para melhorar o visual e conservar o piso. (item 17.8 do contrato)

17.8 Pintura para piso a base de resina acrílica - piso, faixas de demarcação de vagas, PNE, carro forte e similares				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 32	12,00	9,00	0,00	108,00
Foto 33	21,00	4,00	0,00	84,00
Foto 34	36,00	4,82	0,00	173,52
Subtotal			0,00	365,52
Total				365,52

Itens			
17.8	Pintura para piso a base de resina acrílica - piso, faixas de demarcação de vagas, PNE, carro forte e similares	365,52	m²

3 - Pintura automotiva:



Foto 42



Foto 43



Foto 44

- Prezados, ACM do suporte de letreiro da fachada (**cinza escuro**) desbotado e com desgaste. É necessária a pintura automotiva. Necessário **6,00 m de andaime torre metálica**. (itens 17.9 e 2.21 do contrato)

17.9 Pintura Automotiva				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 42	1,50	1,60	0,00	2,40
Foto 43	15,00	1,60	8,50	24,00
Foto 44	6,50	1,60	0,00	10,40
Subtotal			8,50	36,80
Total				28,30

2.21 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	
REFERÊNCIA	TOTAL (m/mês)
Foto 42 a 44	6,00
Total	6,00

Itens			
17.9	Pintura Automotiva	28,30	m²
2.21	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	6,00	m/mês

- Telhado:

- Vista ampla:



Foto 45



Foto 46

1 - Manta aluminizada:



Vários pontos de desgastes na manta existente

32,00 m

0,80 m

Foto 47



Pontos de fixação com manta ressecada

Foto 48



Evidente o rasgo entre telhas na manta

Foto 49

São 25,00 fileiras com
70,00 unidades de
parafusos cada



Foto 50

Descolamento
e rasgos



Foto 51

EPI's
utilizados no
levantamento
do telhado



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61

- Danos internos (autoatendimento, atendimento, suporte e suporte 2):



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65

Atendimento



Foto 66

Atendimento



Foto 67

Atendimento

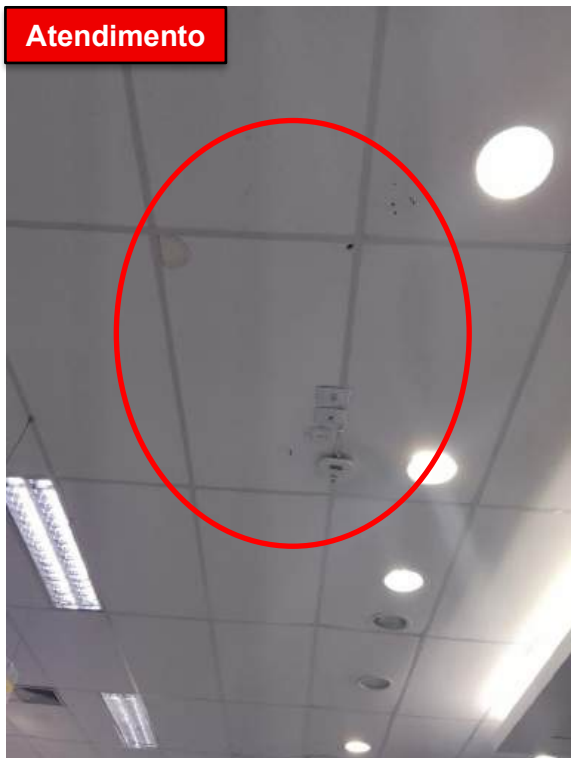


Foto 68

Atendimento



Foto 69

Atendimento



Foto 70

Atendimento

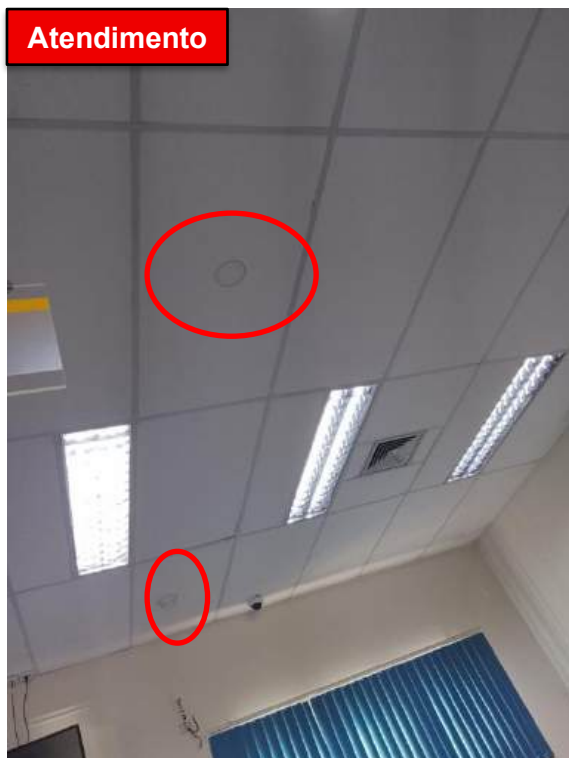


Foto 71

Atendimento



Foto 72

Suporte



Foto 73



Foto 74



Foto 75

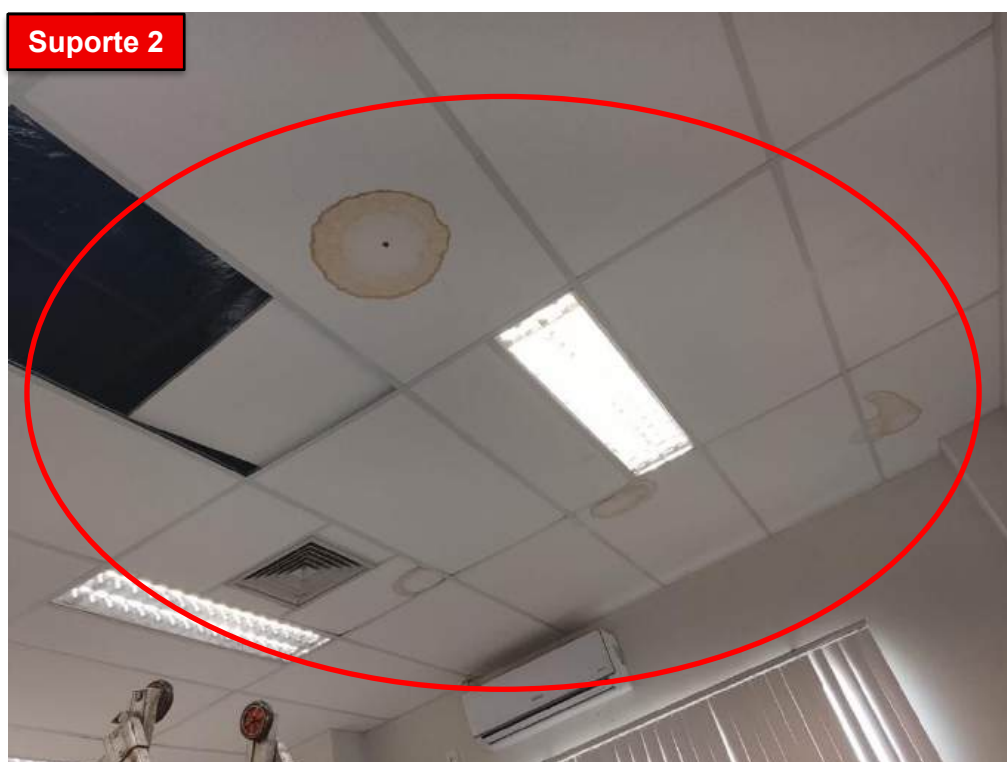


Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79

- Croqui:

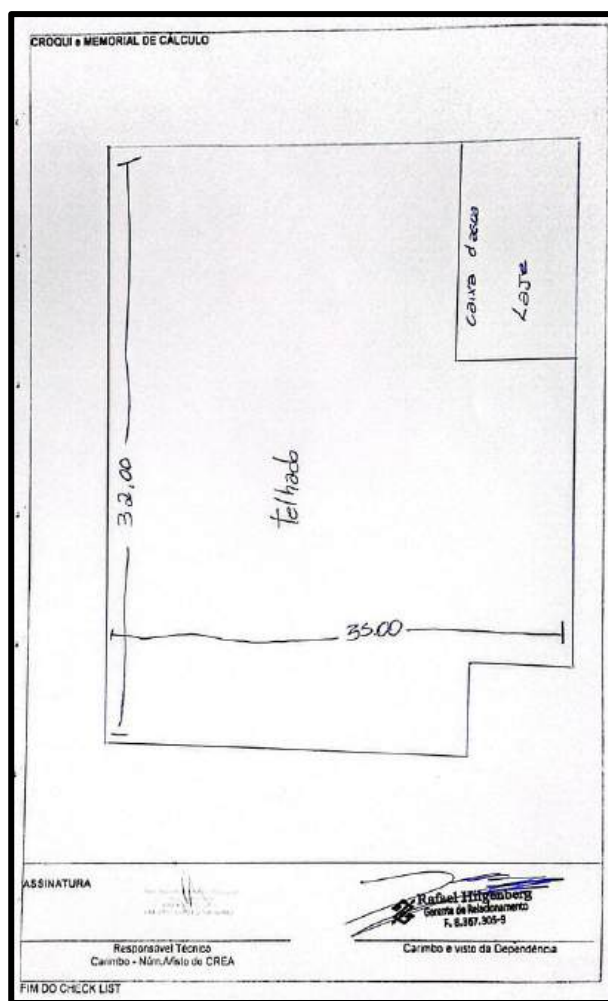


Foto 80

- Prezados, constatamos a presença de danos em diversos pontos do sistema de cobertura, com registros nas áreas de autoatendimento, atendimento, suporte e suporte 2, evidenciando falhas ocasionaram infiltrações e comprometeram a conservação dos ambientes. Foi previsto o consumo de **32,00 x 0,80 m de manta aluminizada**, bem como a vedação de **25,00 fileiras de parafusos, com linhas de 70,00 unidades cada, considerou-se (0,01 x 1,750)**. É necessária a execução dos reparos com aplicação da manta e vedação dos parafusos, a fim de eliminar pontos de infiltração e garantir a estanqueidade do sistema. (item 8.2 do contrato)

8.2 Impermeabilização com manta asfáltica modificada com polímeros aluminizada				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 47	32,00	0,80	0,00	25,60
Foto 50	1750,00	0,01	0,00	17,50
Subtotal			0,00	43,10
Total				43,10

Itens

8.2	Impermeabilização com manta asfáltica modificada com polímeros aluminizada	43,10	m²
-----	--	-------	----

- Memorial de cálculo e itens:

17.4 Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 3	10,00	8,00	1,55	80,00
Foto 4	15,00	3,80	0,00	57,00
Foto 5	2,00	3,50	0,00	7,00
Foto 6	2,28	2,50	0,00	5,70
Foto 7	21,00	8,00	2,15	168,00
Foto 8	24,00	2,80	0,78	67,20
Foto 9	24,00	8,00	0,00	192,00
Foto 10	3,30	4,00	0,00	13,20
Foto 11	3,40	4,00	3,78	13,60
Foto 12	30,00	8,00	1,15	240,00
Foto 13	4,30	4,00	0,00	17,20
Foto 14	4,57	8,00	0,00	36,56
Foto 82	9,75	4,42	13,38	43,10
Foto 105	11,67	3,50	4,55	40,85
Foto 106	11,96	3,50	0,00	41,86
Foto 107	3,20	3,50	0,00	11,20
Foto 108	3,92	3,50	1,89	13,72
Foto 109	4,01	3,50	1,89	14,04
Foto 110	4,96	3,50	1,89	17,36
Foto 111	5,79	3,50	1,89	20,27
Foto 145	3,84	3,50	1,89	13,44
Foto 146	3,84	3,50	0,00	13,44
Foto 147	7,30	3,50	0,00	25,55
Foto 148	7,30	3,50	3,10	25,55
Foto 162	1,20	3,50	0,00	4,20
Foto 163	1,39	3,50	0,00	4,87
Foto 164	1,52	3,50	1,89	5,32
Foto 165	1,55	3,50	1,89	5,43
Foto 166	1,75	3,50	1,89	6,13
Foto 167	10,07	3,50	3,78	35,25
Foto 168	2,28	3,50	0,00	7,98
Foto 169	3,18	3,50	1,89	11,13
Foto 170	7,46	3,50	0,00	26,11
Foto 171	8,98	3,50	3,78	31,43
Foto 172	8,98	3,50	5,42	31,43
Foto 185	2,18	2,04	1,50	4,45
Foto 186	2,18	2,04	0,00	4,45
Foto 187	3,22	2,04	0,00	6,57
Foto 188	3,22	2,04	0,55	6,57
Foto 197	2,20	2,04	0,00	4,49
Foto 198	2,20	2,04	1,50	4,49
Foto 199	3,22	2,04	0,00	6,57
Foto 200	3,22	2,04	0,55	6,57
Foto 207	1,50	1,68	0,00	2,52
Foto 208	1,50	1,68	0,00	2,52
Foto 209	2,53	1,68	0,25	4,25
Foto 210	2,53	1,68	1,50	4,25
Foto 223	1,36	3,50	0,00	4,76
Foto 224	1,43	3,50	0,00	5,01
Foto 225	2,79	3,50	0,00	9,77
Foto 226	4,81	3,50	1,89	16,84
Foto 227	5,40	3,50	1,50	18,90

Foto 228	5,90	3,50	0,00	20,65
Foto 229	8,80	3,50	0,00	30,80
Subtotal			69,67	1511,55
Total				1441,82

Itens			
17.4	Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior	1441,82	m²

2.21 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	
REFERÊNCIA	TOTAL (m/mês)
Foto 3 a 31	6,00
Foto 42 a 44	6,00
Total	12,00

Itens			
2.21	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	12,00	m/mês

17.8 Pintura para piso a base de resina acrílica - piso, faixas de demarcação de vagas, PNE, carro forte e similares				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 32	12,00	9,00	0,00	108,00
Foto 33	21,00	4,00	0,00	84,00
Foto 34	36,00	4,82	0,00	173,52
Subtotal			0,00	365,52
Total				365,52

Itens			
17.8	Pintura para piso a base de resina acrílica - piso, faixas de demarcação de vagas, PNE, carro forte e similares	365,52	m²

17.9 Pintura Automotiva				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 42	1,50	1,60	0,00	2,40
Foto 43	15,00	1,60	8,50	24,00
Foto 44	6,50	1,60	0,00	10,40
Subtotal			8,50	36,80
Total				28,30

Itens			
17.9	Pintura Automotiva	28,30	m²

8.2 Impermeabilização com manta asfáltica modificada com polímeros aluminizada				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 47	32,00	0,80	0,00	25,60
Foto 50	1750,00	0,01	0,00	17,50
Subtotal			0,00	43,10
Total				43,10

Itens			
8.2	Impermeabilização com manta asfáltica modificada com polímeros aluminizada	43,10	m ²

17.11 Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m ²)
Foto 83	9,75	4,43	9,72	43,19
Subtotal			9,72	43,19
Total				33,47

Itens			
17.11	Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.	33,47	m ²

17.2 Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m ²)
Foto 87 e 89	0,20	1,00	0,00	0,20
Foto 117	0,25	1,00	0,00	0,25
Foto 230 e 231	0,30	1,00	0,00	0,30
Subtotal			0,00	0,75
Total				0,75

Itens			
17.2	Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos	0,75	m ²

13.12 Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	
REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 82 e 83	5,00
Foto 105 e 107	6,00
Foto 145	2,00
Foto 163, 170 e 172	4,00
Foto 217 a 221	2,00
Foto 224 a 229	18,00
Total	37,00

Itens			
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	37,00	un

29.43 Vedações em geral (janelas, portas, pias e similares)	
REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 87	1,00
Foto 231	1,00
Total	2,00

Itens			
29.43	Vedações em geral (janelas, portas, pias e similares)	2,00	un

12.10 Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 92 a 96	1,25	0,63	0,00	0,79
Foto 123 a 131	1,25	0,63	0,00	0,79
Foto 155 a 157	1,25	0,63	0,00	0,79
Foto 238 a 239	1,25	0,63	0,00	0,79
Subtotal			0,00	3,16
Total				42,53

Itens			
12.10	Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura	42,53	m²

2.18 Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m³)
Foto 92 a 96	10,24	1,00	0,00	10,24
Foto 102 e 103	3,50	1,00	0,00	3,50
Foto 123 a 131	19,69	1,00	0,00	19,69
Foto 155 a 157	5,51	1,00	0,00	5,51
Foto 181 a 183	11,81	1,00	0,00	11,81
Rodapé	20,30	0,10	0,00	2,03
Foto 217 a 221	18,94	1,00	0,00	18,94
Foto 238 a 239	7,09	1,00	0,00	7,09
Subtotal			0,00	78,81
Total (DIVIDIDO POR 10)				7,87

Itens			
2.18	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)	7,87	m³

29.2 Adesivos padrão BB (ex: remus, estilo, high-tech, nova ambiência, padrão 98 ou similares) com/sem mensagens (segurança, horário da agência, SAA, ou similares.)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m)
Foto 97	1,78	1,00	0,00	1,78
Foto 98	2,98	1,00	0,00	2,98
Foto 99	2,99	1,00	0,00	2,99
Foto 100	2,99	1,00	0,00	2,99
Subtotal			0,00	10,74
Total				10,74

Itens			
29.2	Adesivos padrão BB (ex: remus, estilo, high-tech, nova ambiência, padrão 98 ou similares) com/sem mensagens (segurança, horário da agência, SAA, ou similares.)	10,74	M

29.24 Remoção de adesivos e limpeza				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)

Foto 97 a 100	10,74	1,00	0,00	10,74
Foto 101	0,90	1,00	0,00	0,90
Subtotal			0,00	11,64
Total (DIVIDIDO POR 10)				1,16

Itens			
29.24	Remoção de adesivos e limpeza	1,16	m ²

29.8 Grafema em vinil adesivo jateado	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 101	1,00
Total	1,00

Itens			
29.8	Grafema em vinil adesivo jateado	1,00	UN

10.20 Capacho - fornecimento e instalação				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m ²)
Foto 102 e 103	3,50	1,00	0,00	3,50
Subtotal			0,00	3,50
Total				3,50

Itens			
10.20	Capacho - fornecimento e instalação	3,50	m ²

13.5 Desmontagem de estação de trabalho ou mesa de reunião	
REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 106	5,00
Total	5,00

Itens			
13.5	Desmontagem de estação de trabalho ou mesa de reunião	5,00	un

13.9 Montagem de estação de trabalho ou mesa de reunião	
REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 106	5,00
Total	5,00

Itens			
13.9	Montagem de estação de trabalho ou mesa de reunião	5,00	un

19.34 Lâmpada LED Bulbo ou PAR20	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 137 a 143	18,00
Total	18,00

Itens			
19.34	Lâmpada LED Bulbo ou PAR20	18,00	UN

10.14 Piso em Porcelanato				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	8,95	1,20	0,00	10,74
Rodapé	20,30	0,10	0,00	2,03
Foto 217 a 221	5,92	3,20	0,00	18,94
Subtotal			0,00	31,71
Total				32,99

Itens			
10.14	Piso em Porcelanato	32,99	m²

2.4 Demolição de pisos em geral (ladrilho hidráulico, camada de enchimento, cerâmica, porcelanato, mármore, granito, pedra e madeira) – Manual				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	8,95	1,20	0,00	10,74
Rodapé	20,30	0,10	0,00	2,03
Foto 217 a 221	5,92	3,20	0,00	18,94
Subtotal			0,00	31,71
Total				32,99

Itens			
2.4	Demolição de pisos em geral (ladrilho hidráulico, camada de enchimento, cerâmica, porcelanato, mármore, granito, pedra e madeira) - Manual	32,99	m²

10.1 Regularização de base ou contrapiso				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	8,95	1,20	0,00	10,74
Rodapé	20,30	0,10	0,00	2,03
Foto 217 a 221	5,92	3,20	0,00	18,94
Subtotal			0,00	31,71
Total				31,71

Itens			
10.1	Regularização de base ou contrapiso	31,71	m²

10.5 Peitoril ou soleira de granito, assentado e rejuntado				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	0,90	1,00	0,00	0,90
Subtotal			0,00	0,90
Total (X5)				4,50

Itens			
10.5	Peitoril ou soleira de granito, assentado e rejuntado	4,50	m

29.11 Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	8,00	1,00	0,00	8,00
Subtotal			0,00	8,00
Total				8,00

Itens			
29.11	Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha)	8,00	M

28.11 Ducha higiênica manual cromada	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 195	1,00
Total	1,00

Itens			
28.11	Ducha higiênica manual cromada	1,00	UN

28.28 Torneira para lavatório de mesa, fechamento automático	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 204 e 205	2,00
Total	2,00

Itens			
28.28	Torneira para lavatório de mesa, fechamento automático	2,00	UN

28.32 Torneira para banheiro PNE com alavanca para acionamento	
REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 211 e 212	1,00
Total	1,00

Itens			
28.32	Torneira para banheiro PNE com alavanca para acionamento	1,00	un

28.34 Dosador de sabão tipo dispenser de parede	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 213	1,00
Total	1,00

Itens			
28.34	Dosador de sabão tipo dispenser de parede	1,00	UN

19.37 Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 246 a 249	8,00

Total

8,00


Itens

19.37

Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W

8,00

UN



Ygor Augusto Fernandes Ferrugem
Engenheiro Civil
CREA: 1017279403
CREA MG: GO1017279403D MG

Assinatura Responsável Técnico
Ygor Augusto Fernandes Ferrugem
CREA MG: GO1017279403D MG

Andre Luis da Silva Lopes
Eng. Eletricista
CREA. 5070611683/D-SF



5070611683/D-SF

Assinatura Responsável Técnico
ANDRÉ LUIS DA SILVA LOPES
CREA: 5070611683/D-SF
