

## RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO



|                               |                     |                                    |                                |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO |                     | Contrato:                          | 2024.7421.2056                 |
|                               |                     | Nr. Ordem de Serviço:              | 250195430                      |
|                               |                     | Elaboração: Ygor Augusto Fernandes | Data de Elaboração: 10/04/2026 |
| Agência:                      | 1753/00             | Tipo de relatório:                 | Data de Atendimento:           |
| Nome:                         | CARMOPOLIS DE MINAS |                                    |                                |
| UF:                           | MG                  | Preventivo                         | 24/03/2026                     |



## Dados da Dependência

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Endereço:</b> R. LUIZ ALVES,126 - - - - CEP: 0                                           |
| <b>Responsável da Dependência:</b> F2268209 - SISTEMA                                       |
| <b>Responsável Técnico:</b> Laura Mota                                                      |
| <b>Responsável Técnico/Empresa:</b> Ygor Augusto Fernandes Ferrugem – CREA: 1017279403/D-GO |



Foto 1

- **Descrição do serviço:** Informamos a realização de visita técnica à agência para levantamento preventivo. A atividade contou com o acompanhamento integral do gerente **Luciano Vilela de Faria** – Matrícula **6334696-6**. Durante a vistoria, foram identificadas necessidades de intervenção nos seguintes itens.

# SUMÁRIO

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>- Área externa:</b>                               | Erro! Indicador não definido. |
| 1 - Pintura automotiva:                              | Erro! Indicador não definido. |
| 2 - Película e policarbonato:                        | Erro! Indicador não definido. |
| <b>- Área interna:</b>                               | Erro! Indicador não definido. |
| <b>1 - SAA (sala de autoatendimento):</b>            | Erro! Indicador não definido. |
| 1.1 - Pintura acrílica:                              | Erro! Indicador não definido. |
| 1.2 - Pintura automotiva:                            | Erro! Indicador não definido. |
| 1.3 - Piso tátil:                                    | Erro! Indicador não definido. |
| 1.4 - Fita de piso:                                  | Erro! Indicador não definido. |
| 1.5 - Lâmpadas:                                      | Erro! Indicador não definido. |
| 1.6 - Ajuste de carenagem:                           | Erro! Indicador não definido. |
| <b>2 - Atendimento:</b>                              | Erro! Indicador não definido. |
| 2.1 - Pintura acrílica:                              | Erro! Indicador não definido. |
| 2.2 - Piso tátil:                                    | Erro! Indicador não definido. |
| 2.3 - Fita de piso:                                  | Erro! Indicador não definido. |
| 2.4 - Teclado:                                       | Erro! Indicador não definido. |
| 2.5 - Lâmpadas:                                      | Erro! Indicador não definido. |
| 2.6 - Ponto elétrico:                                | Erro! Indicador não definido. |
| 2.7 - Bebedouro:                                     | Erro! Indicador não definido. |
| <b>3 - CAIEX:</b>                                    | Erro! Indicador não definido. |
| 3.1 - Pintura acrílica:                              | Erro! Indicador não definido. |
| 3.2 - Pintura esmalte em porta:                      | Erro! Indicador não definido. |
| <b>4 - Corredor:</b>                                 | Erro! Indicador não definido. |
| 4.1 - Pintura acrílica:                              | Erro! Indicador não definido. |
| <b>5 - Banheiro PNE:</b>                             | Erro! Indicador não definido. |
| 5.1 - Pintura esmalte em porta:                      | Erro! Indicador não definido. |
| 5.2 - Fechadura:                                     | Erro! Indicador não definido. |
| 5.3 - Alarme PNE:                                    | Erro! Indicador não definido. |
| 5.4 - Ducha higiênica:                               | Erro! Indicador não definido. |
| 5.5 - Tampa de ralo:                                 | Erro! Indicador não definido. |
| <b>6 - Banheiro feminino:</b>                        | Erro! Indicador não definido. |
| 6.1 - Pintura esmalte em porta:                      | Erro! Indicador não definido. |
| <b>7 - Banheiro masculino:</b>                       | Erro! Indicador não definido. |
| 7.1 - Pintura esmalte em porta:                      | Erro! Indicador não definido. |
| 7.2 - Controle de acesso:                            | Erro! Indicador não definido. |
| 7.3 - Solicitação do gerente (reduzidor de pressão): | Erro! Indicador não definido. |
| <b>8 - Copa:</b>                                     | Erro! Indicador não definido. |
| 8.1 - Pintura acrílica:                              | Erro! Indicador não definido. |
| <b>9 - Corredor de abastecimento:</b>                | Erro! Indicador não definido. |
| 9.1 - Pintura acrílica:                              | Erro! Indicador não definido. |
| 9.2 - Tampa cega:                                    | Erro! Indicador não definido. |
| 9.3 - Solicitação do gerente (mola aérea):           | Erro! Indicador não definido. |
| <b>10 - Tesouraria:</b>                              | Erro! Indicador não definido. |
| 10.1 - Pintura acrílica:                             | Erro! Indicador não definido. |
| <b>11 - Sala cofre:</b>                              | Erro! Indicador não definido. |
| 11.1 - Pintura esmalte em porta:                     | Erro! Indicador não definido. |
| <b>12 - Casa de máquinas:</b>                        | Erro! Indicador não definido. |

12.1 - Pintura esmalte em porta: \_\_\_\_\_ Erro! Indicador não definido.

**13 - Escadarias acesso ao subsolo:** \_\_\_\_\_ Erro! Indicador não definido.

13.1 - Pintura acrílica: \_\_\_\_\_ Erro! Indicador não definido.

**- Subsolo:** \_\_\_\_\_ **4**

**1 - Sala online:** \_\_\_\_\_ **4**

1.1 - Pintura acrílica: \_\_\_\_\_ 5

1.2 - Pintura esmalte em porta: \_\_\_\_\_ 10

**2 - Sala de reunião:** \_\_\_\_\_ **12**

2.1 - Pintura acrílica: \_\_\_\_\_ 13

**3 - Arquivo 1:** \_\_\_\_\_ **16**

3.1 - Pintura acrílica: \_\_\_\_\_ 17

**4 - Arquivo 2:** \_\_\_\_\_ **20**

4.1 - Pintura acrílica: \_\_\_\_\_ 21

**5 - Depósito 1:** \_\_\_\_\_ **27**

**6 - Depósito 2:** \_\_\_\_\_ **28**

6.1 - Pintura acrílica: \_\_\_\_\_ 29

**7 - Corredor subsolo:** \_\_\_\_\_ **32**

7.1 - Pintura acrílica: \_\_\_\_\_ 33

**- Memorial de cálculo e itens:** \_\_\_\_\_ **36**

- Subsolo:

**1 - Sala online:**

- Vista ampla:



Foto 2



Foto 3

1.1 - Pintura acrílica:

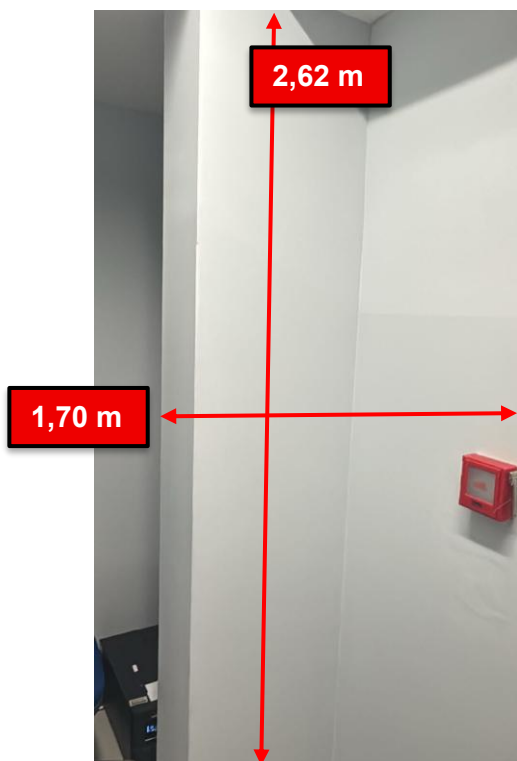


Foto 4

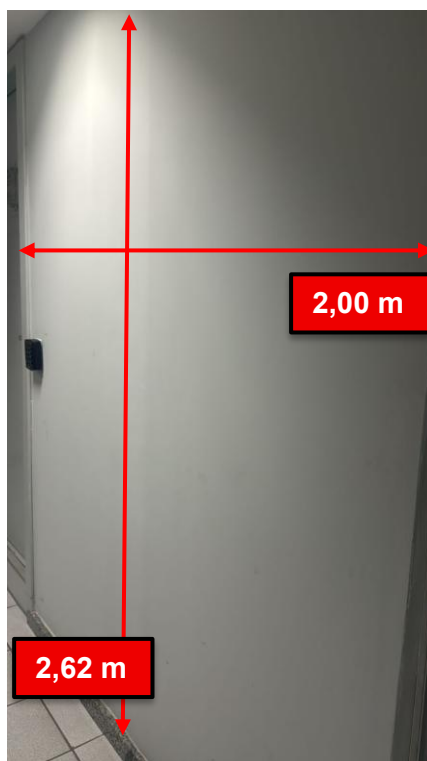


Foto 5

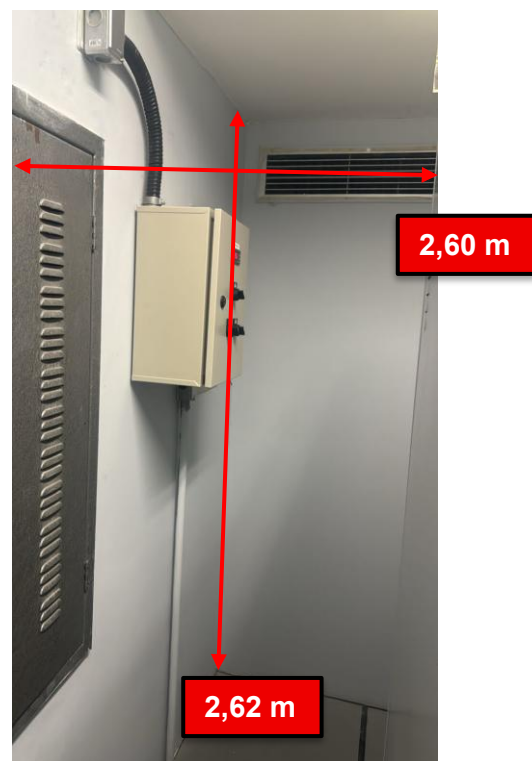


Foto 6

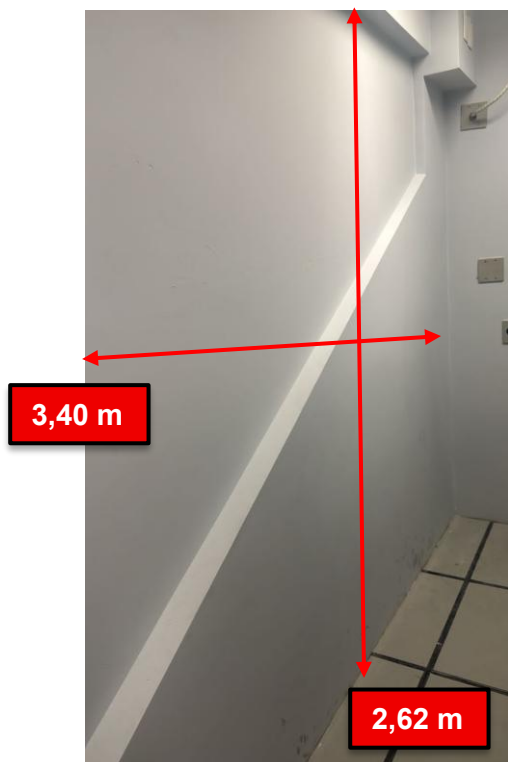


Foto 7



Foto 8



- Detalhes:

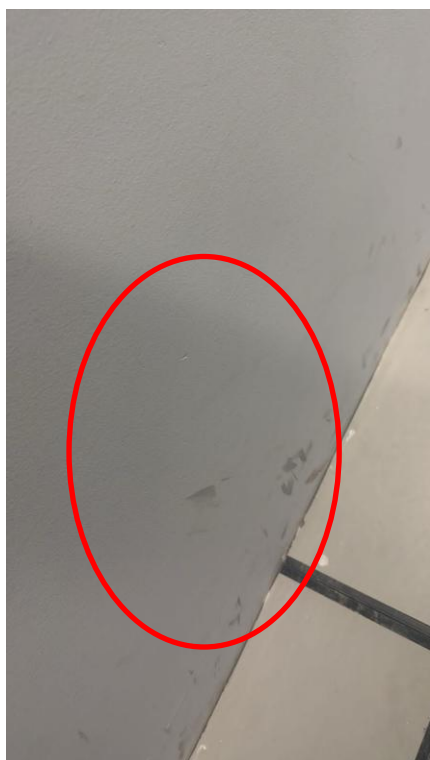


Foto 9

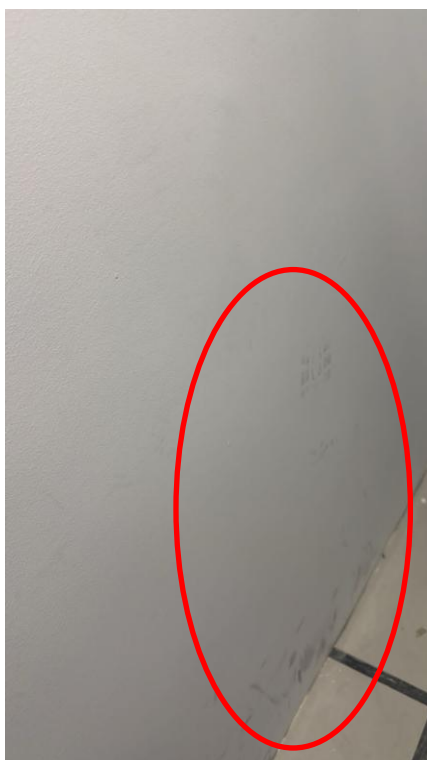


Foto 10



Foto 11



Foto 12

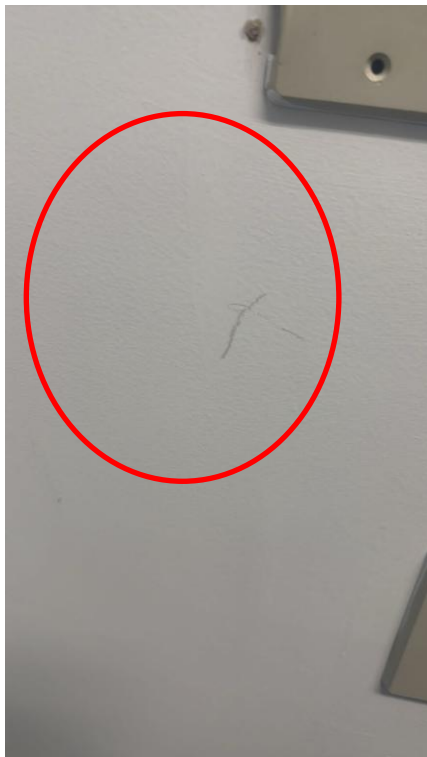


Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18

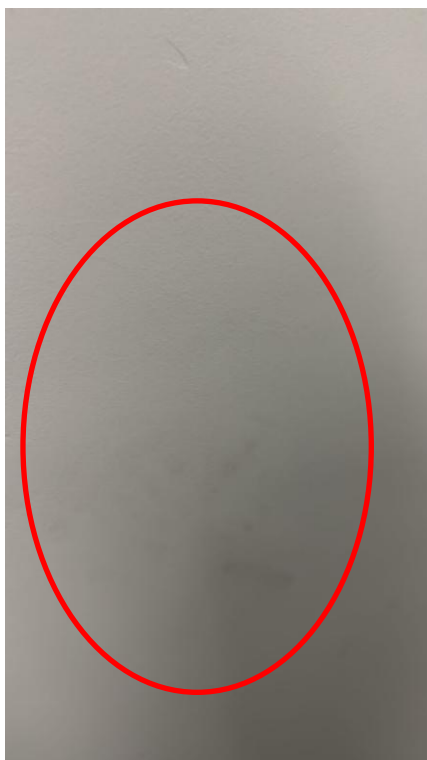


Foto 19

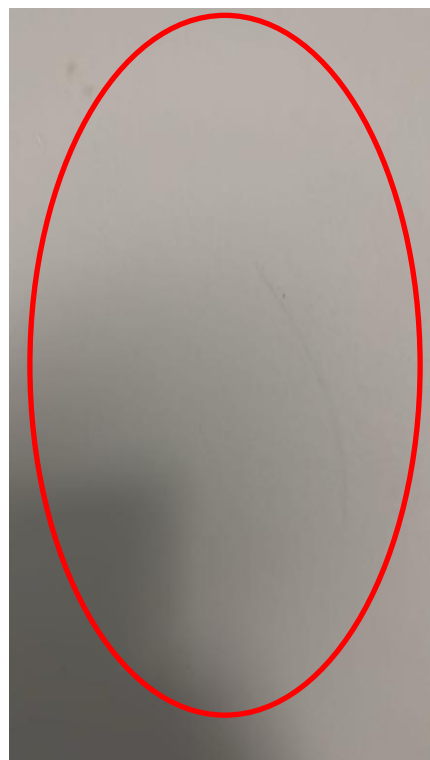


Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



- Prezados, paredes da sala online **(33,66 m²)** estão sujas, manchadas e desgastadas. Necessária repintura com tinta acrílica premium acetinada para restauração do acabamento e conservação da superfície. (item 17.11 do contrato)

| Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11) |             |            |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                                                                                                                             | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 340                                                                                                                                                                               | 1,70        | 2,62       | 0,00     | 4,45       |
| Foto 341                                                                                                                                                                               | 2,00        | 2,62       | 0,00     | 5,24       |
| Foto 342                                                                                                                                                                               | 2,60        | 2,62       | 0,92     | 6,81       |
| Foto 343                                                                                                                                                                               | 3,40        | 2,62       | 0,00     | 8,91       |
| Foto 344                                                                                                                                                                               | 3,50        | 2,62       | 0,00     | 9,17       |
| Subtotal                                                                                                                                                                               |             |            | 0,92     | 34,58      |
| Total                                                                                                                                                                                  |             |            |          | 33,66      |

| Itens |                                                                                                                                                                                |       |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 17.11 | Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. | 33,66 | m² |

**1.2 - Pintura esmalte em porta:**

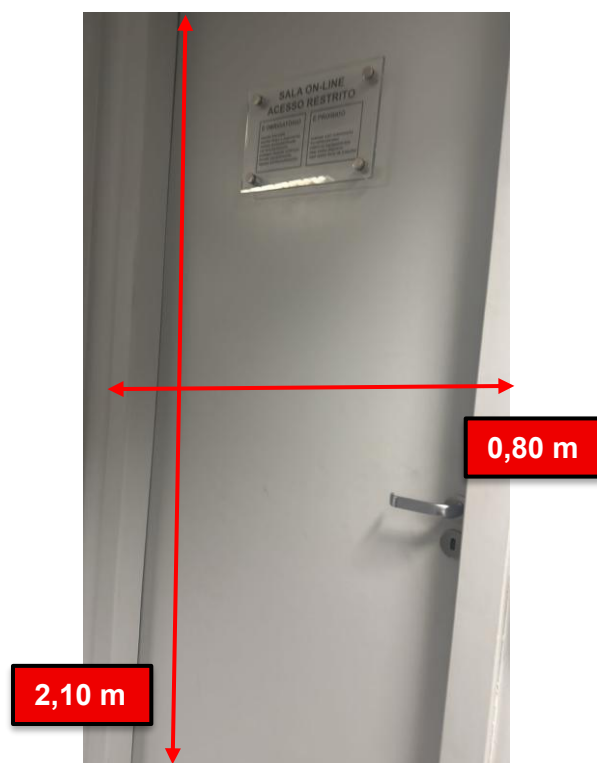


Foto 25

**- Detalhes:**



Foto 26



Foto 27

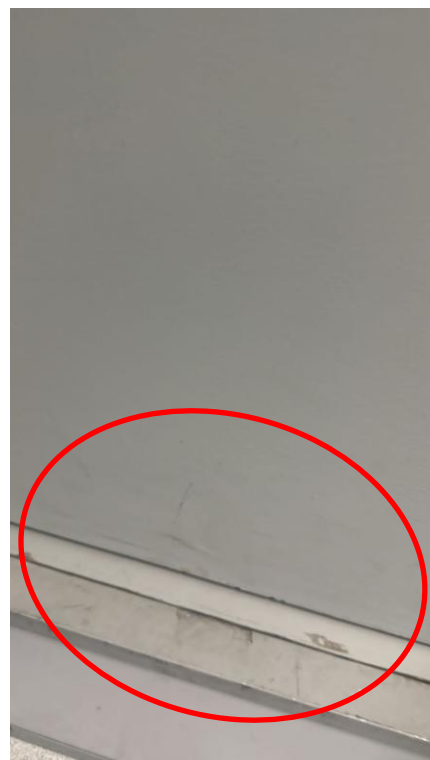


Foto 28

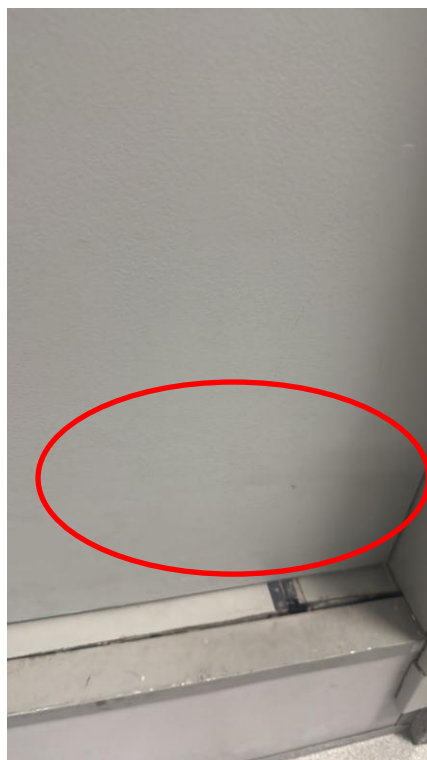


Foto 29

- Prezados, porta da sala online com pintura em esmalte desgastada, apresentando manchas e falhas no acabamento. É necessária a pintura em esmalte **(5,04 m²)** para recompor a estética e manter a conservação. (item 17.7 do contrato)

| Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento (ITEM 17.7) |             |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                             | LARGURA (m) | ALTURA (m) | TOTAL (m²) |
| Foto 361 a 365                                                                         | 0,80        | 2,10       | 1,68       |
| Total (X3)                                                                             |             |            | 5,04       |

| Itens |                                                                            |      |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 17.7  | Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento | 5,04 | m² |

## 2 - Sala de reunião:

- Vista ampla:



Foto 30

2.1 - Pintura acrílica:

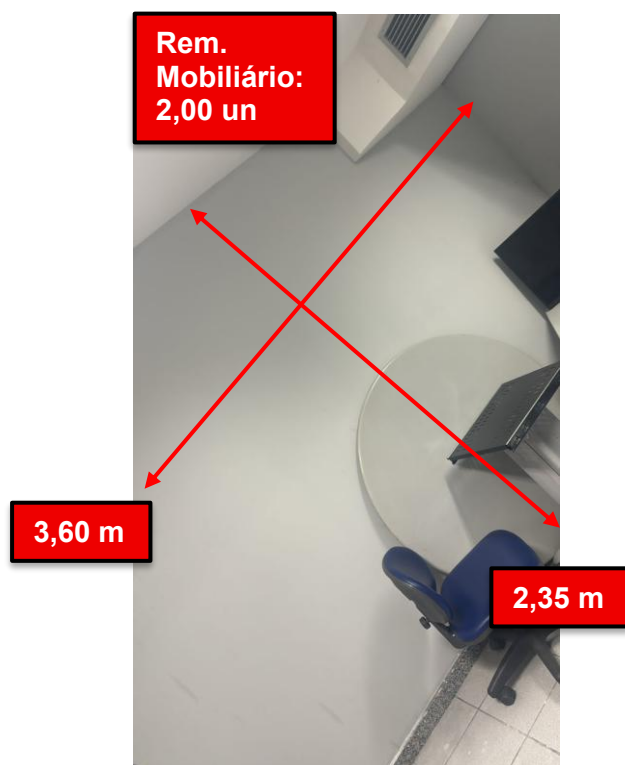


Foto 31

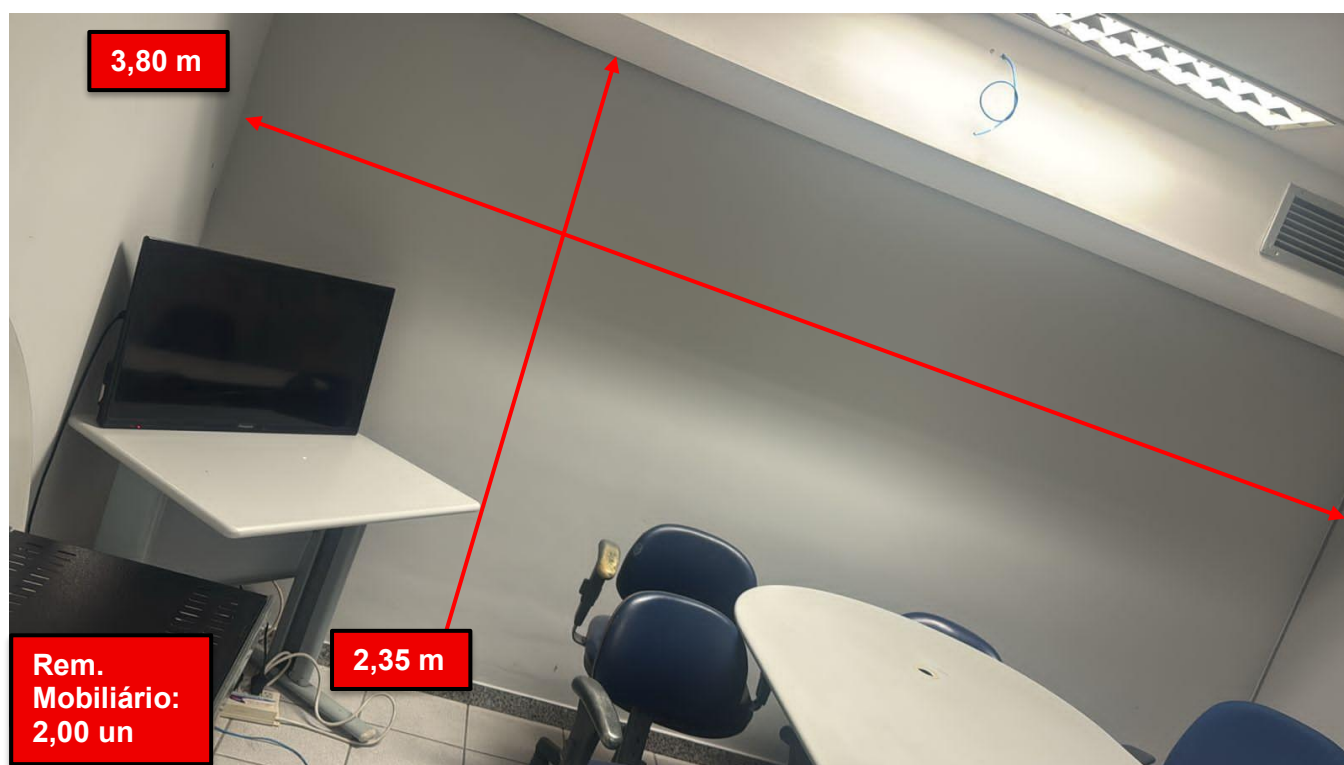


Foto 32



- Detalhes:



Foto 33

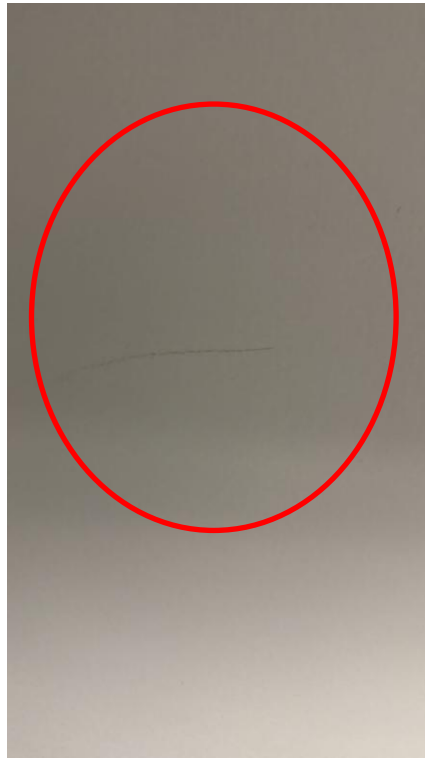


Foto 34



Foto 35

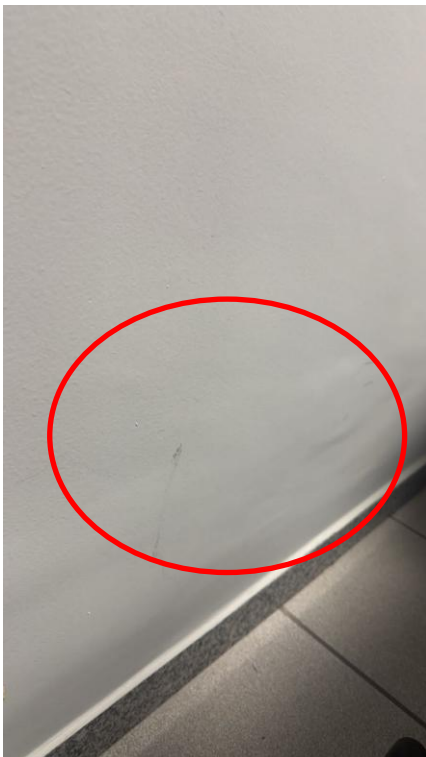


Foto 36

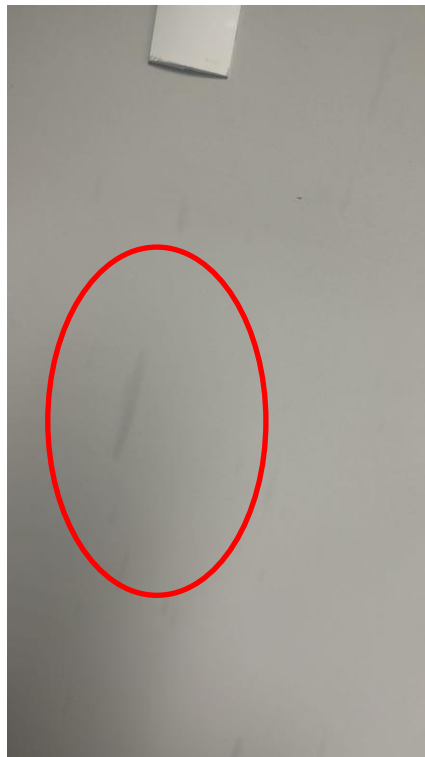


Foto 37

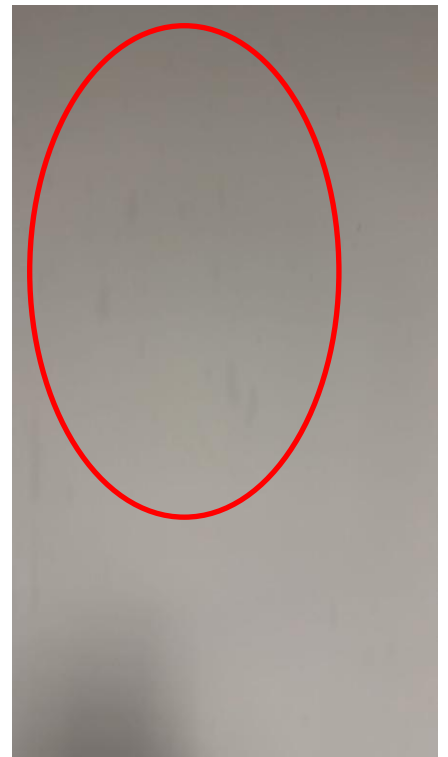


Foto 38

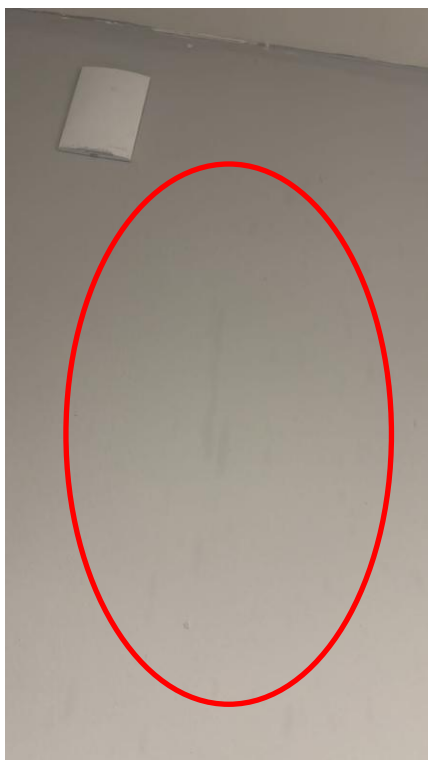


Foto 39

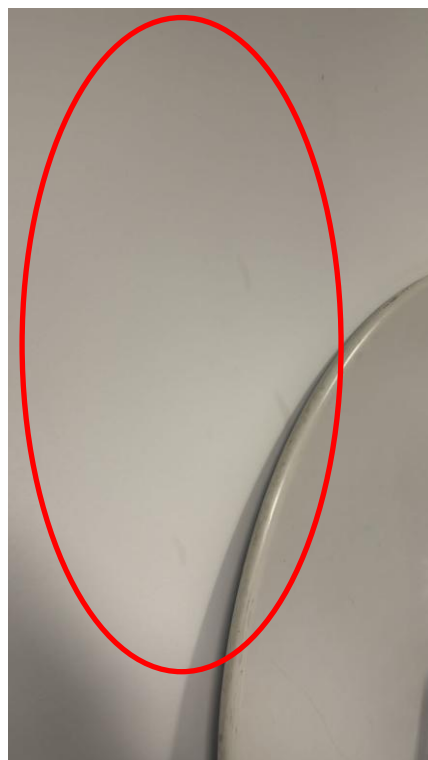


Foto 40

- Prezados, paredes da sala de reunião (**17,39 m²**) estão sujas, manchadas e desgastadas. Necessária repintura com tinta acrílica premium acetinada, incluindo deslocamento temporário de **4,00 unidades de mobiliário** para acesso à superfície. (itens 17.11 e 13.12 do contrato)

| Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11) |             |            |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                                                                                                                             | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 367                                                                                                                                                                               | 3,60        | 2,35       | 0,00     | 8,46       |
| Foto 368                                                                                                                                                                               | 3,80        | 2,35       | 0,00     | 8,93       |
| Subtotal                                                                                                                                                                               |             |            | 0,00     | 17,39      |
| Total                                                                                                                                                                                  |             |            |          | 17,39      |

| Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12) |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                            | TOTAL (UN) |
| Foto 367 e 368                                                        | 4,00       |
| Total                                                                 | 4,00       |

| Itens |                                                                                                                                                                                |       |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 17.11 | Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. | 17,39 | m² |
| 13.12 | Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência                                                                                                                  | 4,00  | un |

### 3 - Arquivo 1:

- Vista ampla:



Foto 41

3.1 - Pintura acrílica:

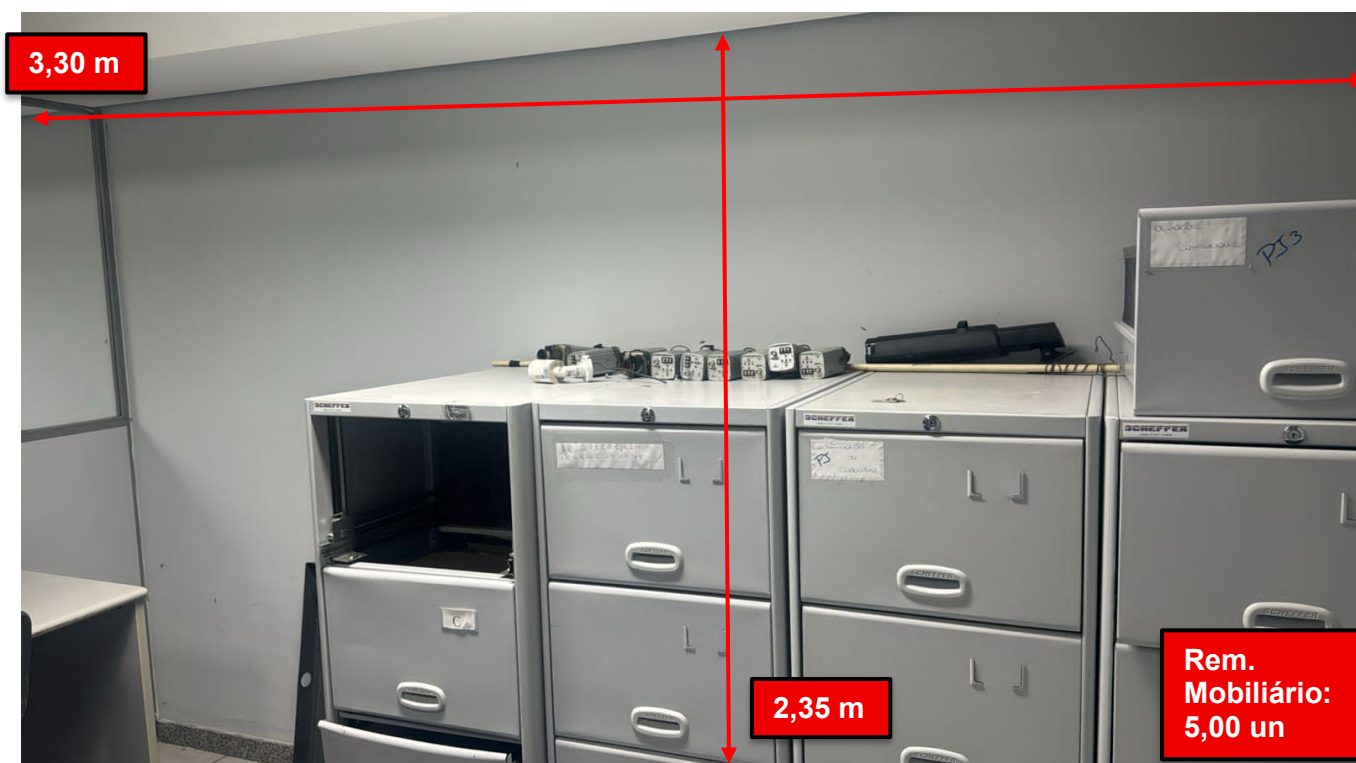


Foto 42

- Detalhes:



Foto 43

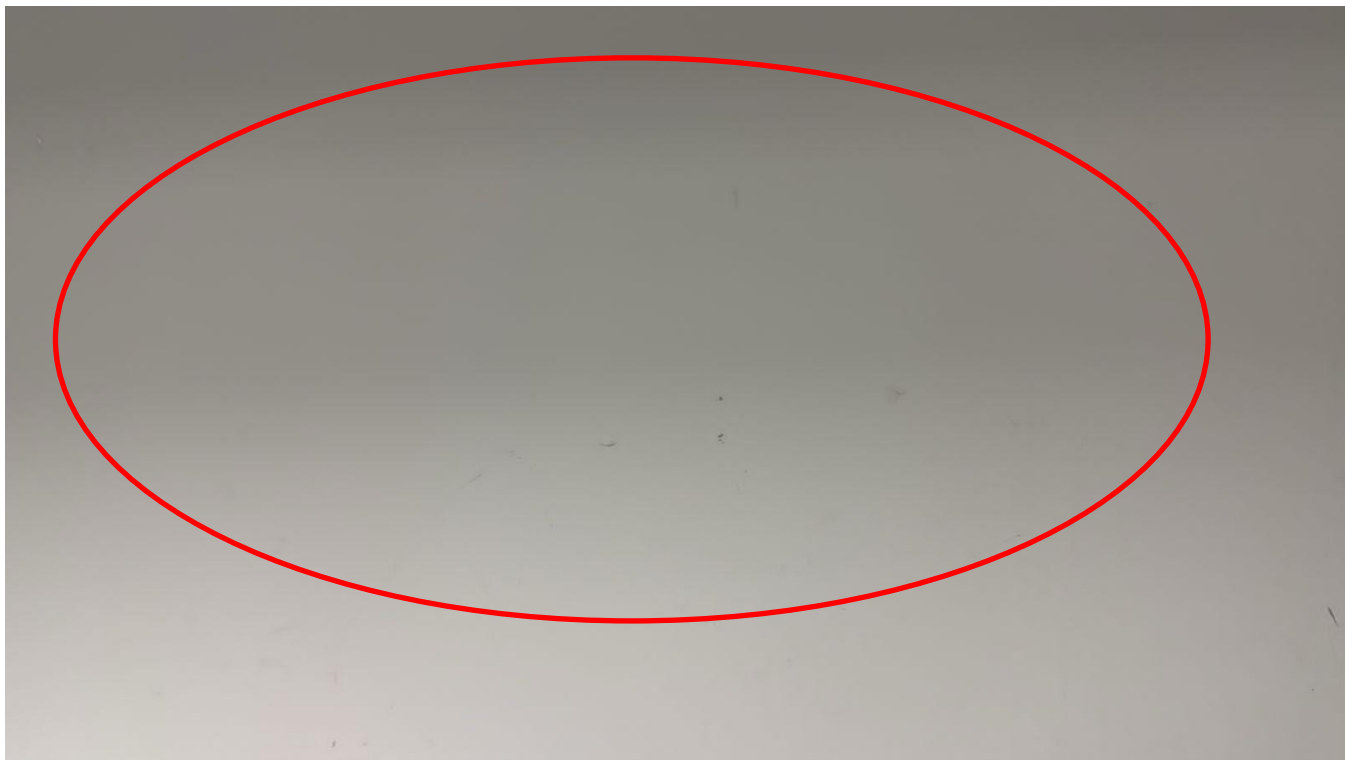


Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47

- Prezados, parede do arquivo 1 (**7,76 m²**) está suja, manchada e desgastada. Necessária repintura com tinta acrílica premium acetinada, incluindo deslocamento temporário de **5,00 unidades de mobiliário** para acesso à superfície. (itens 17.11 e 13.12 do contrato)

| Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11) |             |            |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                                                                                                                             | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 378 a 383                                                                                                                                                                         | 3,30        | 2,35       | 0,00     | 7,76       |
| Subtotal                                                                                                                                                                               |             |            | 0,00     | 7,76       |
| Total                                                                                                                                                                                  |             |            |          | 7,76       |

| Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12) |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                            | TOTAL (UN) |
| Foto 378                                                              | 5,00       |
| Total                                                                 | 5,00       |

| Itens |                                                                                                                                                                                |      |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 17.11 | Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. | 7,76 | m² |
| 13.12 | Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência                                                                                                                  | 5,00 | un |



#### 4 - Arquivo 2:

- Vista ampla:



Foto 48

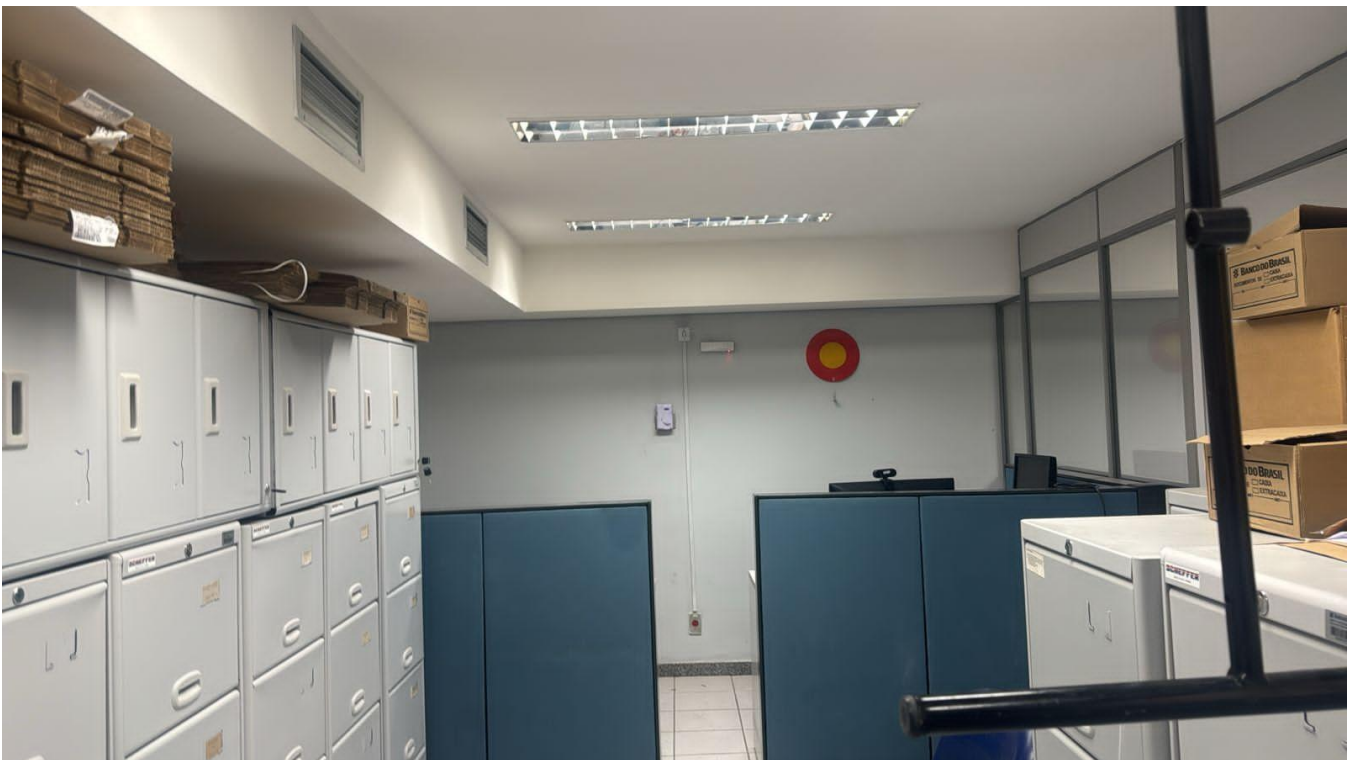


Foto 49

4.1 - Pintura acrílica:

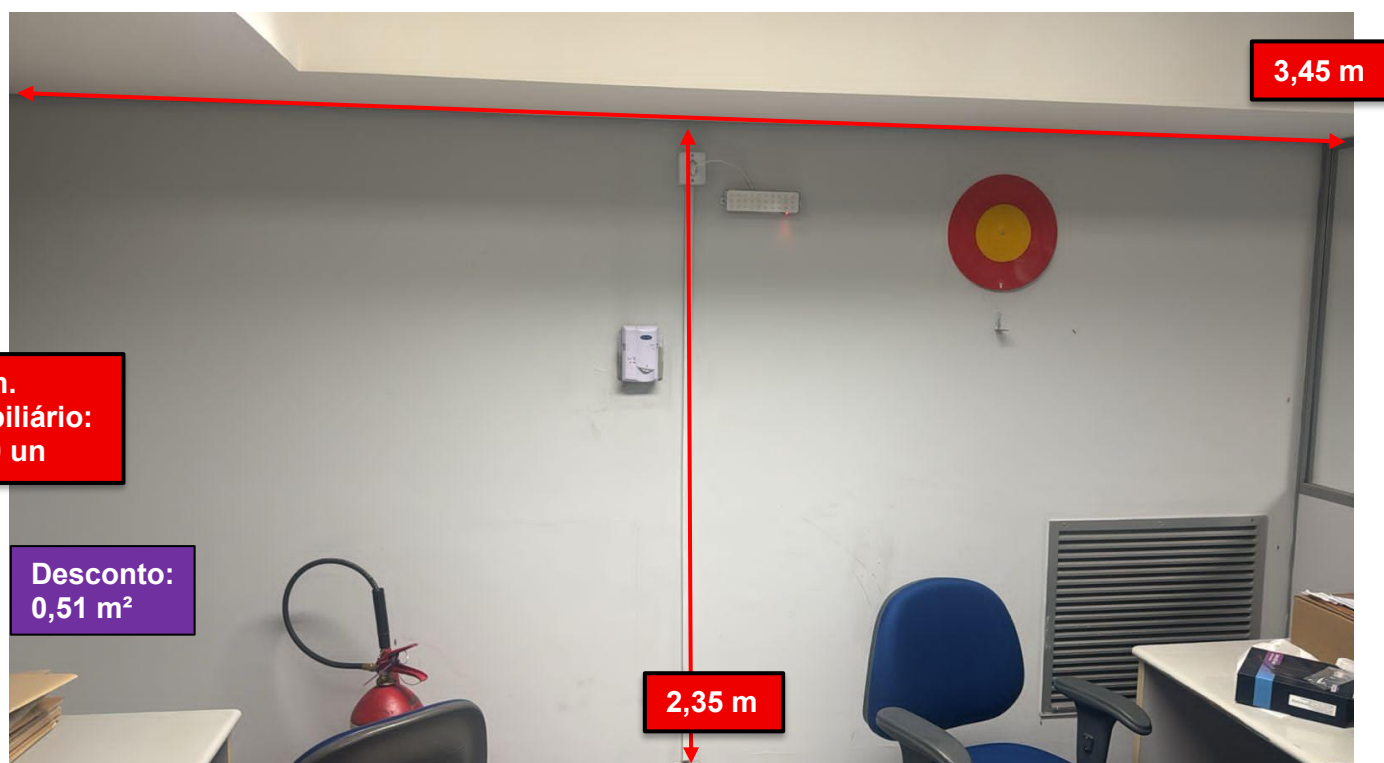


Foto 50



Foto 51



Foto 52

- Detalhes:



Foto 53



Foto 54



Foto 55





Foto 56

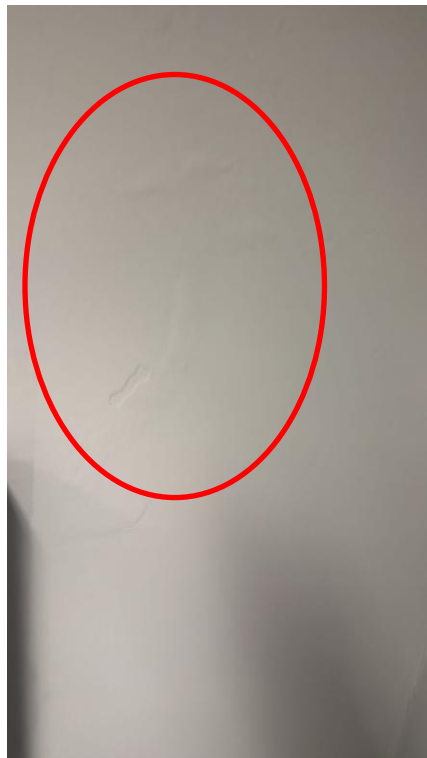


Foto 57

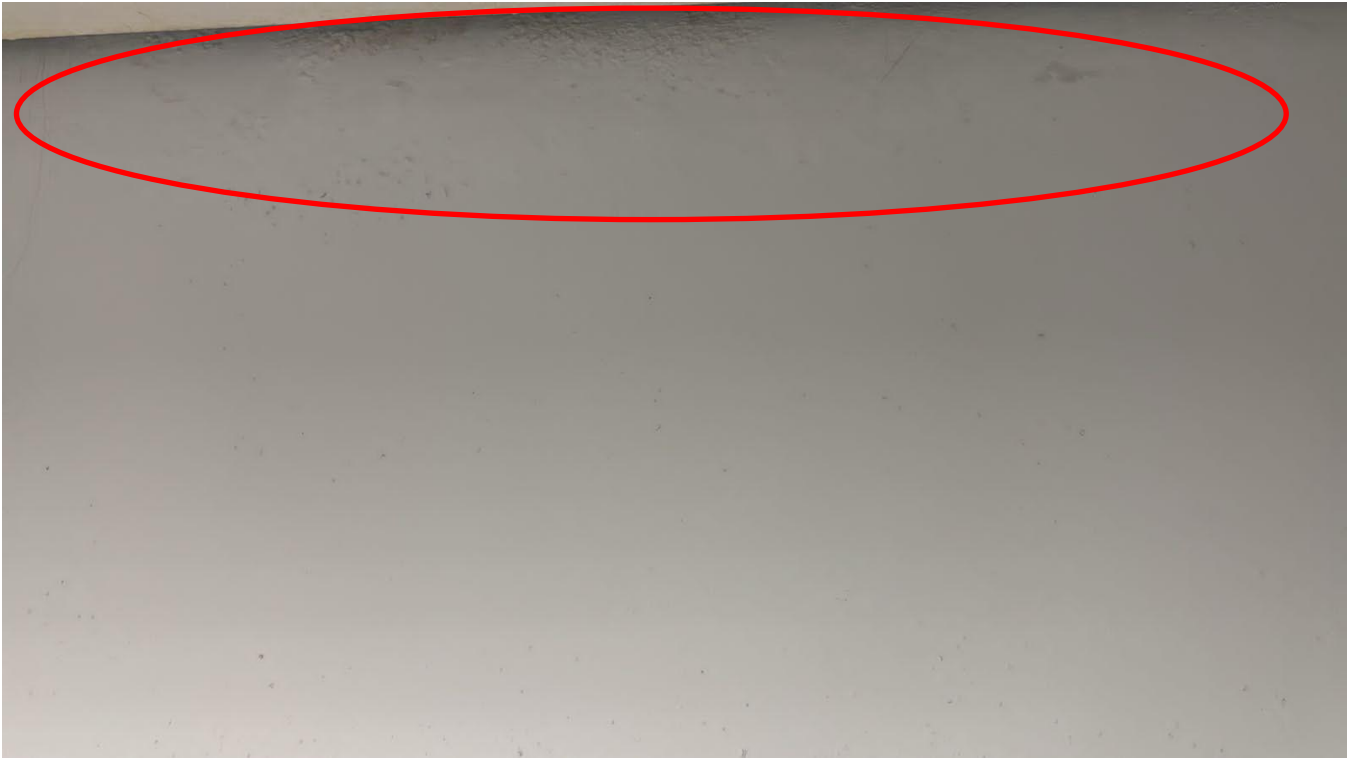


Foto 58

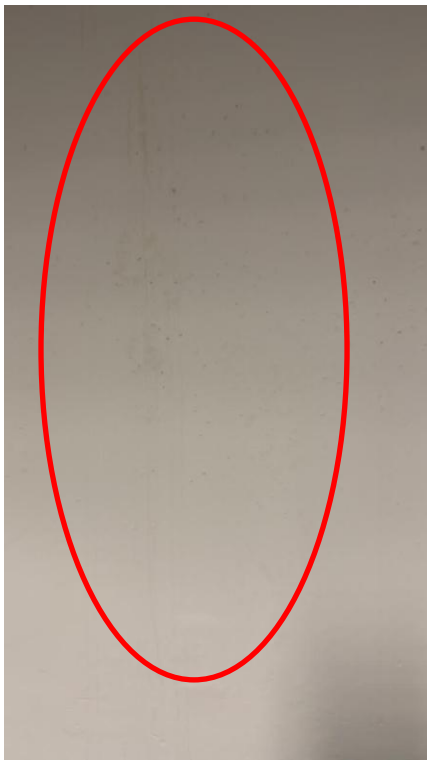


Foto 59

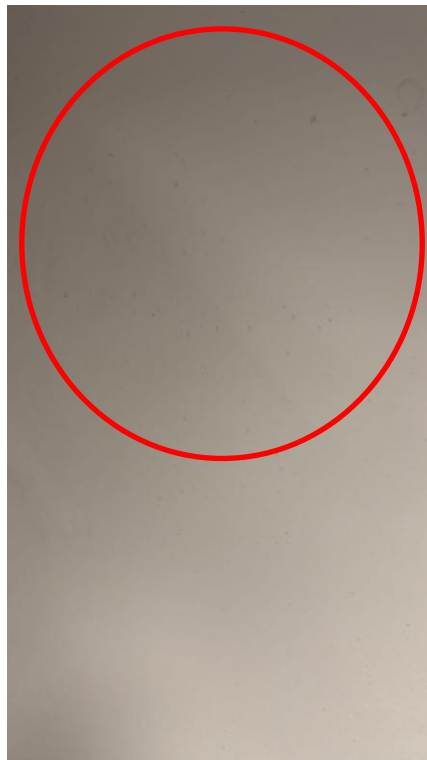


Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



- Prezados, paredes do arquivo 2 **(30,75 m²)** estão sujas, manchadas e desgastadas. Necessária repintura com tinta acrílica premium acetinada, incluindo deslocamento temporário de **21,00 unidades de mobiliário** e ajuste de **2,00 unidades de divisórias/carenagens** para acesso à superfície. (itens 17.11, 13.12 e 29.22 do contrato)

| Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11) |             |            |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                                                                                                                             | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 386                                                                                                                                                                               | 3,45        | 2,35       | 0,51     | 8,11       |
| Foto 387                                                                                                                                                                               | 3,00        | 2,35       | 0,00     | 7,05       |
| Foto 388                                                                                                                                                                               | 6,85        | 2,35       | 0,00     | 16,10      |
| Subtotal                                                                                                                                                                               |             |            | 0,51     | 31,26      |
| Total                                                                                                                                                                                  |             |            |          | 30,75      |

| Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12) |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                            | TOTAL (UN) |
| Foto 386 a 388                                                        | 21,00      |
| Total                                                                 | 21,00      |

| Ajuste de biombo, divisórias, carenagens e mobiliário em geral (29.22) |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                             | TOTAL (UN) |
| Foto 388                                                               | 2,00       |
| Total                                                                  | 2,00       |

| Itens |                                                                                                                                                                                |       |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 17.11 | Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. | 30,75 | m² |
| 13.12 | Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência                                                                                                                  | 21,00 | un |
| 29.22 | Ajuste de biombo, divisórias, carenagens e mobiliário em geral                                                                                                                 | 2,00  | un |

## 5 - Depósito 1:

- Vista ampla:



Foto 66

- Prezados, superfícies do Depósito 1 encontram-se em bom estado de conservação, sem sinais de desgaste, avarias ou necessidade de intervenção. Não há necessidade de manutenção no momento.

## 6 - Depósito 2:

- Vista ampla:



Foto 67



Foto 68

6.1 - Pintura acrílica:



Foto 69

- Detalhes:



Foto 70

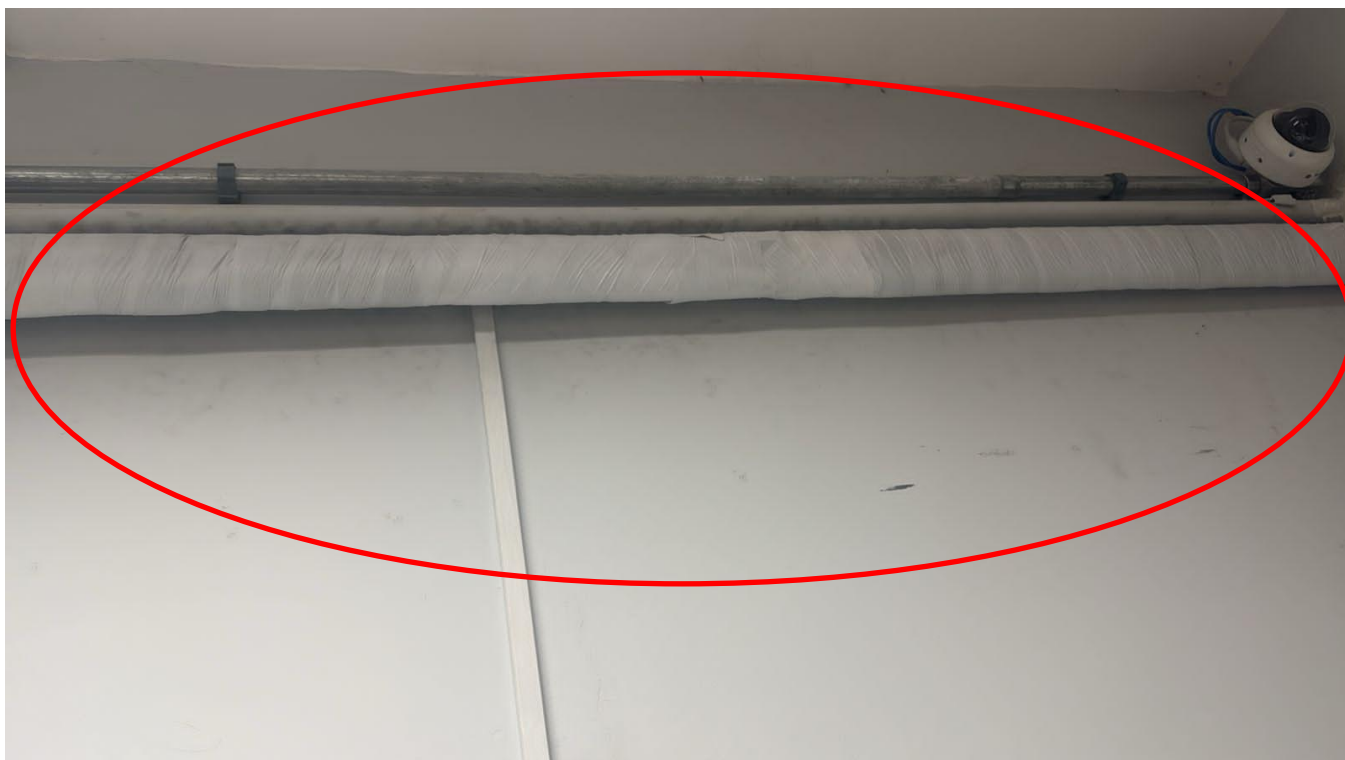


Foto 71



Foto 72

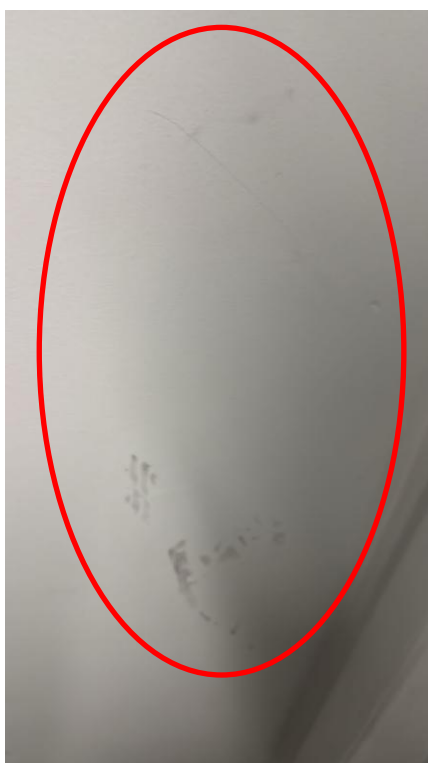


Foto 73

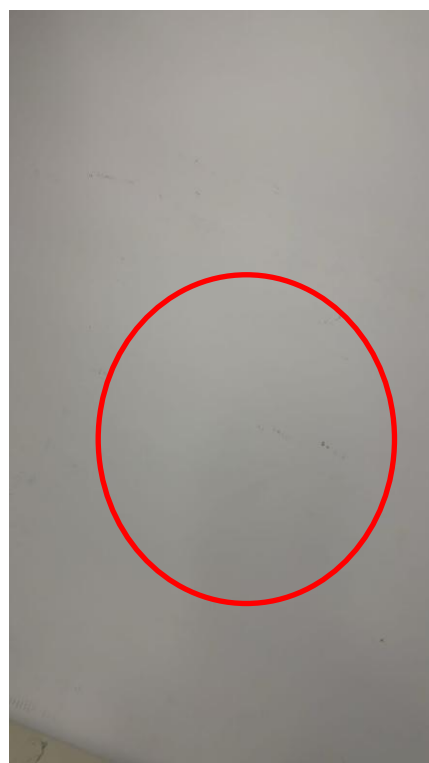


Foto 74

- Prezados, parede do depósito 2 (**18,48 m²**) está suja, manchada e desgastada. Necessária repintura com tinta acrílica premium acetinada, incluindo deslocamento temporário de **5,00 unidades de mobiliário** para acesso à superfície. (itens 17.11 e 13.12 do contrato)

| Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11) |             |            |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                                                                                                                             | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 405 a 410                                                                                                                                                                         | 6,60        | 2,80       | 0,00     | 18,48      |
| Subtotal                                                                                                                                                                               |             |            | 0,00     | 18,48      |
| Total                                                                                                                                                                                  |             |            |          | 18,48      |

| Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12) |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                            | TOTAL (UN) |
| Foto 405                                                              | 5,00       |
| Total                                                                 | 5,00       |

| Itens |                                                                                                                                                                                |       |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 17.11 | Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. | 18,48 | m² |
| 13.12 | Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência                                                                                                                  | 5,00  | un |



## 7 - Corredor subsolo:

- Vista ampla:



Foto 75

7.1 - Pintura acrílica:



Foto 76

- Detalhes:

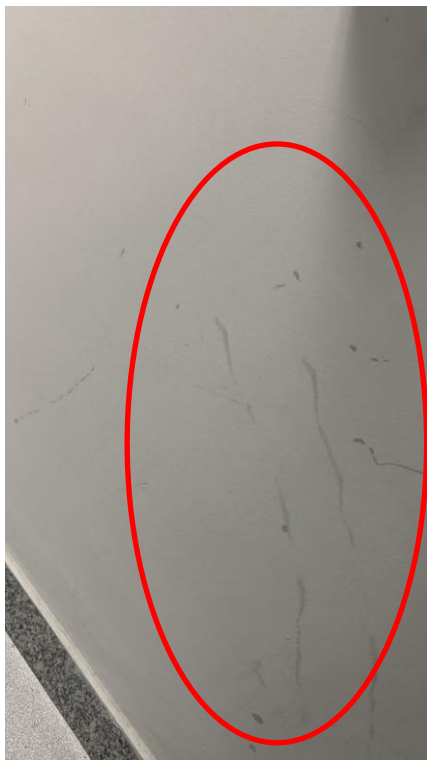


Foto 77

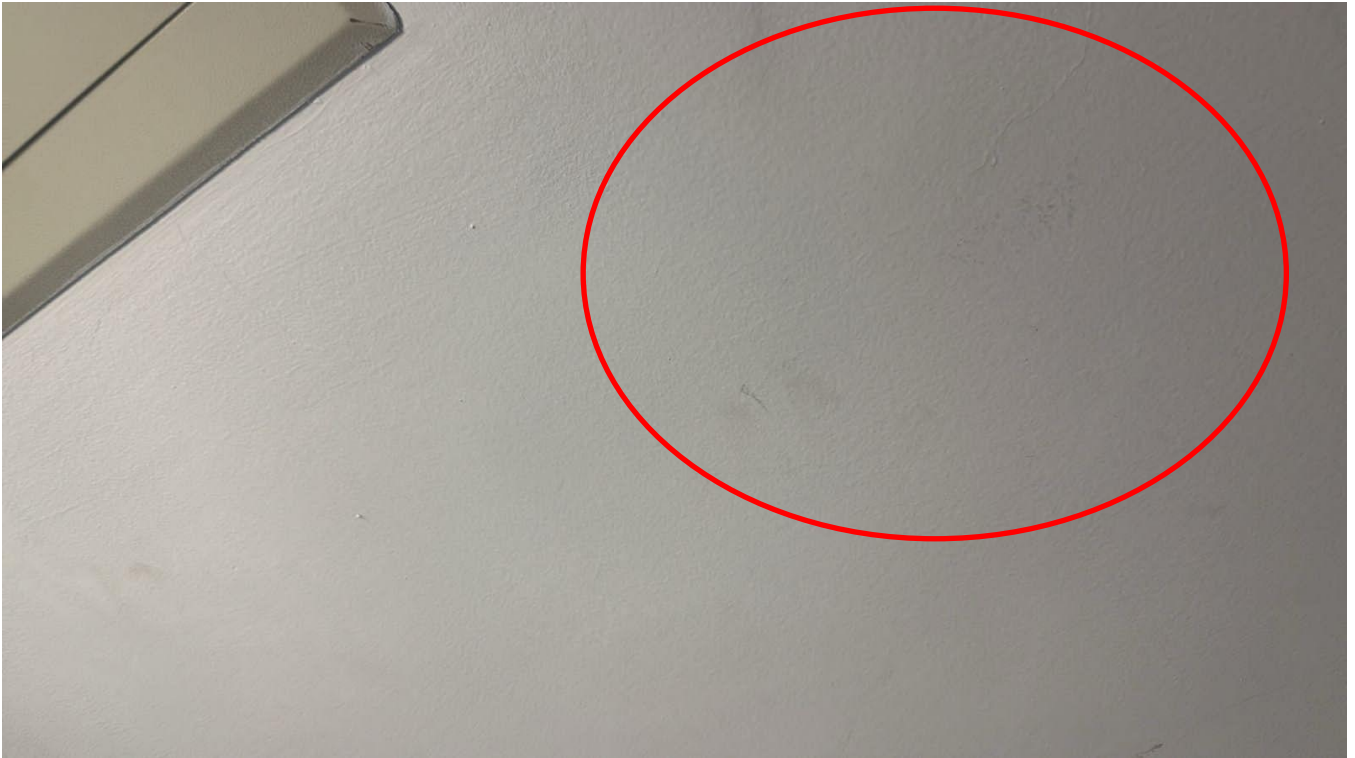


Foto 78

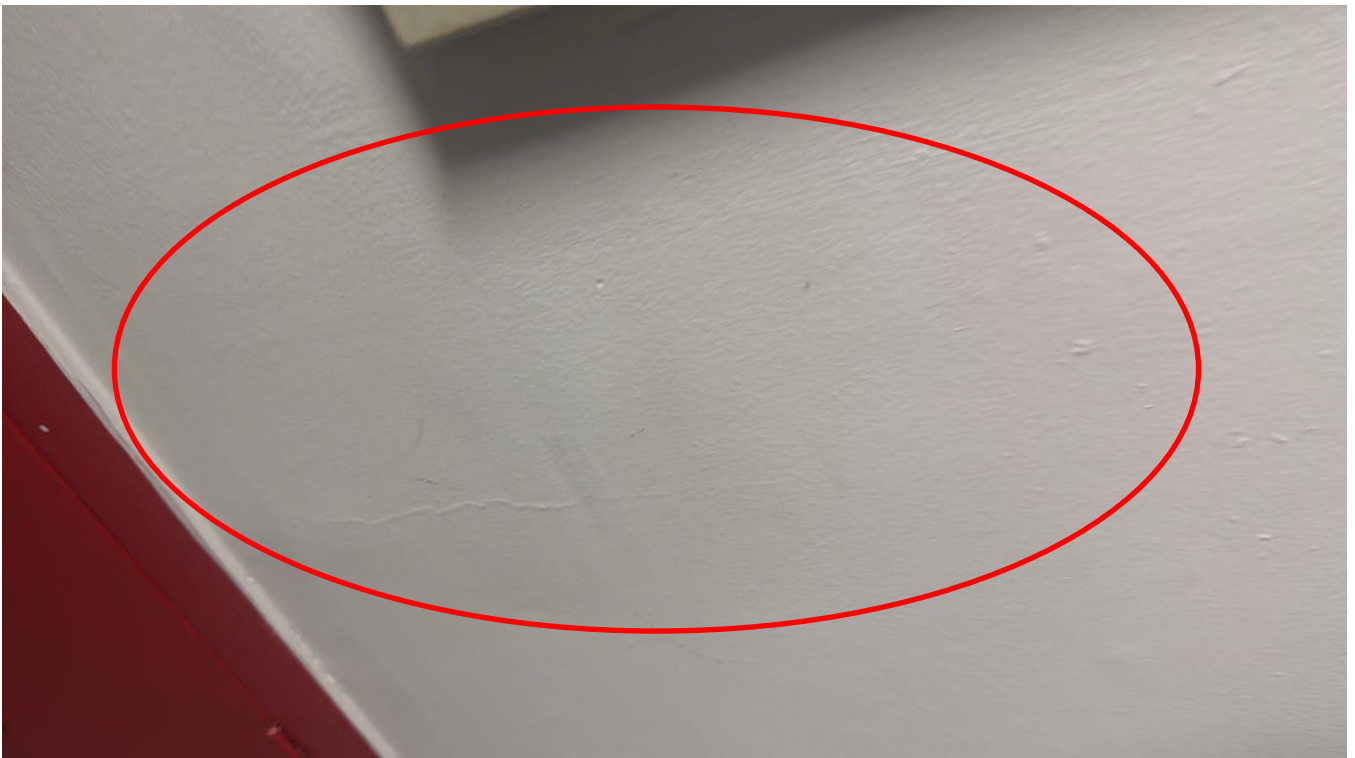


Foto 79

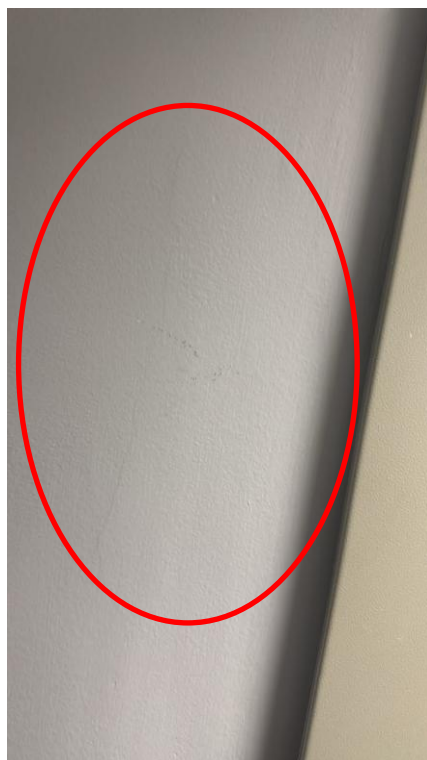


Foto 80

- Prezados, parede do corredor do subsolo (**6,96 m<sup>2</sup>**) está suja, manchada e desgastada. Necessária repintura com tinta acrílica premium acetinada, incluindo deslocamento temporário de **1,00 unidade de mobiliário** para acesso à superfície. (itens 17.11 e 13.12 do contrato)

| Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11) |             |            |          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|-------------------------|
| REFERÊNCIA                                                                                                                                                                             | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m <sup>2</sup> ) |
| Foto 412 a 416                                                                                                                                                                         | 3,70        | 2,35       | 1,74     | 8,70                    |
| Subtotal                                                                                                                                                                               |             |            | 1,74     | 8,70                    |
| Total                                                                                                                                                                                  |             |            |          | 6,96                    |

| Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12) |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                            | TOTAL (UN) |
| Foto 412                                                              | 1,00       |
| Total                                                                 | 1,00       |

| Itens |                                                                                                                                                                                |      |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 17.11 | Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. | 6,96 | m <sup>2</sup> |
| 13.12 | Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência                                                                                                                  | 1,00 | un             |

- Memorial de cálculo e itens:

| Pintura Automotiva (17.9) |             |            |          |            |
|---------------------------|-------------|------------|----------|------------|
| REFERÊNCIA                | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 2                    | 10,00       | 1,20       | 7,00     | 12,00      |
| Foto 3                    | 10,00       | 1,20       | 0,00     | 12,00      |
| Foto 4                    | 8,10        | 0,80       | 0,00     | 6,48       |
| Foto 5                    | 7,00        | 1,00       | 0,00     | 7,00       |
| Foto 6                    | 1,00        | 1,00       | 0,00     | 2,00       |
| Foto 79 a 85              | 0,87        | 0,90       | 0,00     | 0,78       |
| Subtotal                  |             |            | 7,00     | 40,26      |
| Total                     |             |            |          | 37,18      |

| Itens |                    |       |    |
|-------|--------------------|-------|----|
| 17.9  | Pintura Automotiva | 37,18 | m² |

| Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico (2.21) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| REFERÊNCIA                                                    | TOTAL (m/mês) |
| Foto 2 a 16                                                   | 6,00          |
| Total                                                         | 6,00          |

| Itens |                                                        |      |       |
|-------|--------------------------------------------------------|------|-------|
| 2.21  | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | 6,00 | m/mês |

| Sinalização externa - substituição de policarbonato e película, inclusive montagem da marca e instalação (para medalhão, bandeira, letreiros, pórticos de acesso e similares) (29.14) |             |            |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                                                                                                                            | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 17                                                                                                                                                                               | 0,42        | 2,10       | 0,00     | 0,88       |
| Foto 18                                                                                                                                                                               | 7,00        | 0,80       | 0,00     | 5,60       |
| Foto 19                                                                                                                                                                               | 0,80        | 0,80       | 0,00     | 1,28       |
| Subtotal                                                                                                                                                                              |             |            | 0,00     | 7,76       |
| Total                                                                                                                                                                                 |             |            |          | 7,76       |

| Itens |                                                                                                                                                                               |      |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 29.14 | Sinalização externa - substituição de policarbonato e película, inclusive montagem da marca e instalação (para medalhão, bandeira, letreiros, pórticos de acesso e similares) | 7,76 | M² |

| Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros) (2.18) |             |            |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                             | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m³) |
| Foto 17                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,42        | 2,10       | 0,00     | 0,88       |
| Foto 18                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,00        | 0,80       | 0,00     | 5,60       |
| Foto 19                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,80        | 0,80       | 0,00     | 1,28       |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            | 0,00     | 7,76       |
| Total (DIVIDIDO POR 10)                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |          | 0,77       |

| Itens |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 2.18  | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros) | 0,77 | m³ |

| Recuperação de estruturas metálicas de pórticos de acesso, totens, letreiros, medalhões, bandeiras e brises (14.7) |             |            |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                                                         | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 23 e 27                                                                                                       | 0,50        | 0,20       | 0,00     | 0,10       |
| Subtotal                                                                                                           |             |            | 0,00     | 0,10       |
| Total                                                                                                              |             |            |          | 0,10       |

| Itens |                                                                                                             |      |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 14.7  | Recuperação de estruturas metálicas de pórticos de acesso, totens, letreiros, medalhões, bandeiras e brises | 0,10 | m² |

| Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11) |             |            |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                                                                                                                             | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 31                                                                                                                                                                                | 0,50        | 2,95       | 0,00     | 1,48       |
| Foto 32                                                                                                                                                                                | 1,10        | 2,95       | 0,00     | 3,25       |
| Foto 33                                                                                                                                                                                | 1,70        | 2,95       | 1,89     | 5,02       |
| Foto 34                                                                                                                                                                                | 9,20        | 2,95       | 1,92     | 27,14      |
| Foto 35                                                                                                                                                                                | 0,50        | 2,95       | 0,00     | 1,48       |
| Foto 36                                                                                                                                                                                | 0,50        | 2,95       | 0,00     | 1,48       |
| Foto 37                                                                                                                                                                                | 0,50        | 2,95       | 0,00     | 1,48       |
| Foto 38                                                                                                                                                                                | 1,10        | 2,95       | 0,00     | 3,25       |
| Foto 39                                                                                                                                                                                | 1,10        | 2,95       | 0,00     | 3,25       |
| Foto 40                                                                                                                                                                                | 1,10        | 2,95       | 0,00     | 3,25       |
| Foto 130                                                                                                                                                                               | 0,50        | 2,95       | 0,00     | 1,48       |
| Foto 131                                                                                                                                                                               | 0,50        | 2,95       | 0,00     | 1,48       |
| Foto 132                                                                                                                                                                               | 0,50        | 2,95       | 0,00     | 1,48       |
| Foto 133                                                                                                                                                                               | 1,10        | 2,95       | 0,00     | 3,25       |
| Foto 134                                                                                                                                                                               | 1,10        | 2,95       | 0,00     | 3,25       |
| Foto 135                                                                                                                                                                               | 1,10        | 2,95       | 0,00     | 3,25       |
| Foto 136                                                                                                                                                                               | 1,60        | 2,95       | 0,00     | 4,72       |
| Foto 137                                                                                                                                                                               | 15,70       | 2,95       | 4,50     | 46,32      |
| Foto 138                                                                                                                                                                               | 3,10        | 2,95       | 0,00     | 9,15       |
| Foto 139                                                                                                                                                                               | 4,60        | 2,95       | 0,82     | 13,57      |
| Foto 140                                                                                                                                                                               | 9,70        | 2,95       | 4,50     | 28,62      |
| Foto 206                                                                                                                                                                               | 2,80        | 2,95       | 1,89     | 8,26       |
| Foto 207                                                                                                                                                                               | 4,40        | 2,95       | 0,00     | 12,98      |
| Foto 221                                                                                                                                                                               | 1,25        | 2,95       | 1,89     | 3,69       |
| Foto 222                                                                                                                                                                               | 2,14        | 2,95       | 3,78     | 6,31       |
| Foto 223                                                                                                                                                                               | 3,82        | 2,95       | 5,04     | 11,27      |
| Foto 267                                                                                                                                                                               | 0,50        | 2,95       | 0,00     | 1,48       |
| Foto 268                                                                                                                                                                               | 1,10        | 2,95       | 0,00     | 3,25       |
| Foto 277 a 283                                                                                                                                                                         | 10,50       | 2,95       | 0,00     | 30,98      |
| Foto 289                                                                                                                                                                               | 2,00        | 2,95       | 1,89     | 5,90       |
| Foto 290                                                                                                                                                                               | 2,05        | 2,95       | 0,00     | 6,05       |
| Foto 291                                                                                                                                                                               | 2,50        | 2,95       | 1,89     | 7,38       |
| Foto 292                                                                                                                                                                               | 2,55        | 2,95       | 1,89     | 7,52       |
| Foto 322                                                                                                                                                                               | 3,60        | 1,20       | 0,00     | 4,32       |
| Foto 323                                                                                                                                                                               | 5,50        | 4,35       | 0,00     | 23,93      |
| Foto 324                                                                                                                                                                               | 5,50        | 4,35       | 0,00     | 23,93      |
| Foto 340                                                                                                                                                                               | 1,70        | 2,62       | 0,00     | 4,45       |
| Foto 341                                                                                                                                                                               | 2,00        | 2,62       | 0,00     | 5,24       |
| Foto 342                                                                                                                                                                               | 2,60        | 2,62       | 0,92     | 6,81       |
| Foto 343                                                                                                                                                                               | 3,40        | 2,62       | 0,00     | 8,91       |
| Foto 344                                                                                                                                                                               | 3,50        | 2,62       | 0,00     | 9,17       |
| Foto 367                                                                                                                                                                               | 3,60        | 2,35       | 0,00     | 8,46       |



|                 |      |      |       |        |
|-----------------|------|------|-------|--------|
| Foto 368        | 3,80 | 2,35 | 0,00  | 8,93   |
| Foto 378 a 383  | 3,30 | 2,35 | 0,00  | 7,76   |
| Foto 386        | 3,45 | 2,35 | 0,51  | 8,11   |
| Foto 387        | 3,00 | 2,35 | 0,00  | 7,05   |
| Foto 388        | 6,85 | 2,35 | 0,00  | 16,10  |
| Foto 405 a 410  | 6,60 | 2,80 | 0,00  | 18,48  |
| Foto 412 a 416  | 3,70 | 2,35 | 1,74  | 8,70   |
| <b>Subtotal</b> |      |      | 35,07 | 443,07 |
| <b>Total</b>    |      |      |       | 407,90 |

| Itens |                                                                                                                                                                                |  |        |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------------|
| 17.11 | Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. |  | 407,90 | m <sup>2</sup> |

| Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12) |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| REFERÊNCIA                                                            | TOTAL (un)   |
| Foto 34, 35 e 39                                                      | 8,00         |
| Foto 137, 138 e 140                                                   | 14,00        |
| Foto 206 e 207                                                        | 3,00         |
| Foto 277                                                              | 2,00         |
| Foto 290 e 292                                                        | 2,00         |
| Foto 367 e 368                                                        | 4,00         |
| Foto 378                                                              | 5,00         |
| Foto 386 a 388                                                        | 21,00        |
| Foto 405                                                              | 5,00         |
| Foto 412                                                              | 1,00         |
| <b>Total</b>                                                          | <b>65,00</b> |

| Itens |                                                               |       |    |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------|----|
| 13.12 | Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência | 65,00 | un |

| Piso tátil de borracha - direcional ou alerta (por placa) (29.6) |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| REFERÊNCIA                                                       | TOTAL (UN)   |
| Foto 86 a 103                                                    | 17,00        |
| Foto 192 a 195                                                   | 3,00         |
| <b>Total</b>                                                     | <b>20,00</b> |

| Itens |                                                           |       |    |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|----|
| 29.6  | Piso tátil de borracha - direcional ou alerta (por placa) | 20,00 | UN |

| Retirada de piso tátil com limpeza (2.12) |             |            |          |             |
|-------------------------------------------|-------------|------------|----------|-------------|
| REFERÊNCIA                                | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²)  |
| Foto                                      | 17,00       | 1,00       | 0,00     | 17,00       |
| Foto 192 a 195                            | 3,00        | 1,00       | 0,00     | 3,00        |
| <b>Subtotal</b>                           |             |            | 0,00     | 20,00       |
| <b>Total (DIVIDIDO POR 10)</b>            |             |            |          | <b>2,00</b> |

| Itens |                                    |      |                |
|-------|------------------------------------|------|----------------|
| 2.12  | Retirada de piso tátil com limpeza | 2,00 | m <sup>2</sup> |

| Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha) (29.11) |             |            |          |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|-----------|
| REFERÊNCIA                                                | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m) |
| Foto 104 a 111                                            | 20,00       | 1,00       | 0,00     | 20,00     |
| Foto 196                                                  | 3,00        | 1,00       | 0,00     | 3,00      |
| Subtotal                                                  |             |            | 0,00     | 23,00     |
| Total                                                     |             |            |          | 23,00     |

| Itens |                                                   |       |   |
|-------|---------------------------------------------------|-------|---|
| 29.11 | Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha) | 23,00 | M |

| Remoção de adesivos e limpeza (29.24) |             |            |          |            |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|
| REFERÊNCIA                            | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 104 a 111                        | 20,00       | 1,00       | 0,00     | 20,00      |
| Foto 196                              | 3,00        | 1,00       | 0,00     | 3,00       |
| Subtotal                              |             |            | 0,00     | 23,00      |
| Total (DIVIDIDO POR 10)               |             |            |          | 2,30       |

| Itens |                               |      |    |
|-------|-------------------------------|------|----|
| 29.24 | Remoção de adesivos e limpeza | 2,30 | m² |

| Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W (19.37) |            |
|-------------------------------------------|------------|
| REFERÊNCIA                                | TOTAL (UN) |
| Foto 112                                  | 2,00       |
| Foto 198 a 200                            | 4,00       |
| Total                                     | 6,00       |

| Itens |                                   |      |    |
|-------|-----------------------------------|------|----|
| 19.37 | Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W | 6,00 | UN |

| Lâmpada LED tubular bivolt 9/10W (19.36) |            |
|------------------------------------------|------------|
| REFERÊNCIA                               | TOTAL (UN) |
| Foto 113 a 121                           | 8,00       |
| Total                                    | 8,00       |

| Itens |                                  |      |    |
|-------|----------------------------------|------|----|
| 19.36 | Lâmpada LED tubular bivolt 9/10W | 8,00 | UN |

| Ajuste de biombo, divisórias, carenagens e mobiliário em geral (29.22) |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                             | TOTAL (un) |
| Foto 122 e 123                                                         | 1,00       |
| Foto 388                                                               | 2,00       |
| Total                                                                  | 3,00       |

| Itens |                                                                |      |    |
|-------|----------------------------------------------------------------|------|----|
| 29.22 | Ajuste de biombo, divisórias, carenagens e mobiliário em geral | 3,00 | un |

| Manutenção do Sistema de Controle de Acesso (19.96) |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| REFERÊNCIA                                          | TOTAL (UN)  |
| Foto 197                                            | 1,00        |
| Foto 265                                            | 1,00        |
| <b>Total</b>                                        | <b>2,00</b> |

| Itens |                                             |      |    |
|-------|---------------------------------------------|------|----|
| 19.96 | Manutenção do Sistema de Controle de Acesso | 2,00 | UN |

| Teclado de senhas digital, para controle de acesso (19.98) |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| REFERÊNCIA                                                 | TOTAL (UN)  |
| Foto 197                                                   | 1,00        |
| Foto 265                                                   | 1,00        |
| <b>Total</b>                                               | <b>2,00</b> |

| Itens |                                                    |      |    |
|-------|----------------------------------------------------|------|----|
| 19.98 | Teclado de senhas digital, para controle de acesso | 2,00 | UN |

| Ponto elétrico duplo - Custos Fixos (19.1) |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| REFERÊNCIA                                 | TOTAL (UN)  |
| Foto 201                                   | 1,00        |
| <b>Total</b>                               | <b>1,00</b> |

| Itens |                                     |      |    |
|-------|-------------------------------------|------|----|
| 19.1  | Ponto elétrico duplo - Custos Fixos | 1,00 | UN |

| Correção de vazamentos hidráulicos, inclusive detecção de vazamento (20.14) |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| REFERÊNCIA                                                                  | TOTAL (un)  |
| Foto 202 e 203                                                              | 1,00        |
| <b>Total</b>                                                                | <b>1,00</b> |

| Itens |                                                                     |      |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------|----|
| 20.14 | Correção de vazamentos hidráulicos, inclusive detecção de vazamento | 1,00 | un |

| Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos (ITEM 17.1) |             |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
| REFERÊNCIA                                                                              | LARGURA (m) | ALTURA (m) | TOTAL (m²)   |
| Foto 215 a 218                                                                          | 1,00        | 2,10       | 2,10         |
| Foto 307 a 314                                                                          | 0,90        | 2,10       | 1,89         |
| <b>Subtotal</b>                                                                         |             |            | <b>3,99</b>  |
| <b>Total (X3)</b>                                                                       |             |            | <b>11,97</b> |

| Itens |                                                                             |       |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 17.1  | Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos | 11,97 | m² |

| Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento (ITEM 17.7) |             |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                             | LARGURA (m) | ALTURA (m) | TOTAL (m²) |
| Foto 236 a 239                                                                         | 0,90        | 2,10       | 1,89       |
| Foto 252 a 255                                                                         | 0,80        | 2,10       | 1,68       |
| Foto 261 e 264                                                                         | 0,80        | 2,10       | 1,68       |
| Foto 317 a 320                                                                         | 0,90        | 2,10       | 1,89       |
| Foto 361 a 365                                                                         | 0,80        | 2,10       | 1,68       |
| Subtotal                                                                               |             |            | 8,82       |
| Total (X3)                                                                             |             |            | 26,46      |

| Itens |                                                                            |       |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 17.7  | Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento | 26,46 | m² |

| Ferragem para Porta de madeira (fechadura completa) - Substituição/instalação (15.3) |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                           | TOTAL (cj) |
| Foto 240 e 241                                                                       | 1,00       |
| Total                                                                                | 1,00       |

| Itens |                                                                               |      |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 15.3  | Ferragem para Porta de madeira (fechadura completa) - Substituição/instalação | 1,00 | cj |

| Alarme de emergência sem fio para sanitário de PPNE (botoeira/alarme sonoro e visual) (29.5) |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| REFERÊNCIA                                                                                   | TOTAL (CJ) |
| Foto 242                                                                                     | 1,00       |
| Total                                                                                        | 1,00       |

| Itens |                                                                                       |      |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 29.5  | Alarme de emergência sem fio para sanitário de PPNE (botoeira/alarme sonoro e visual) | 1,00 | CJ |

| Ducha higiênica manual cromada (28.11) |            |
|----------------------------------------|------------|
| REFERÊNCIA                             | TOTAL (UN) |
| Foto 243 e 244                         | 1,00       |
| Total                                  | 1,00       |

| Itens |                                |      |    |
|-------|--------------------------------|------|----|
| 28.11 | Ducha higiênica manual cromada | 1,00 | UN |

| Espelhos / Placas / Tampas (19.6) |            |
|-----------------------------------|------------|
| REFERÊNCIA                        | TOTAL (UN) |
| Foto 245 e 246                    | 1,00       |
| Foto 284                          | 1,00       |
| Total                             | 2,00       |

| Itens |                            |      |    |
|-------|----------------------------|------|----|
| 19.6  | Espelhos / Placas / Tampas | 2,00 | UN |

**LUIZA SILVA FERREIRA  
FERNANDES:04200773163**

Assinado digitalmente por LUIZA SILVA FERREIRA FERNANDES:04200773163  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LUIZA SILVA FERREIRA FERNANDES:04200773163  
Razão: Eu revisei este documento  
Localização:  
Data: 2026.04.14 17:36:33-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

**ANDRE CAMPANEMA DE SOUZA GOMES**  
**Engenheiro Eletricista**  
**CREA 1014260736/D-GO**  
**CREA MG: 48409MG**

---

Assinatura Responsável Técnico  
Andre Campanema de Souza Gomes  
CREA GO: 1014260736/D GO  
CREA MG: 48409MG

*Luiza Silva Ferreira*

**Luiza Silva Ferreira**  
**Engenheira Civil**  
**CREA 1017251924D-GO**

---

Assinatura Responsável Técnico  
Luiza Silva Ferreira  
CREA GO: 1017251924D GO
